



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

POR PUGLIA 2000-2006 - MISURA 6.2 - AZIONE C)

**Bando “Iniziative a sostegno del sistema
delle imprese e delle professioni”**

CONTRAENTE

C.I.M.O. - ASMD PUGLIA

TITOLO DEL PROGETTO

**“626 NET”: La Telemedicina per la
sicurezza nelle attività produttive**

RAPPORTO TECNICO FINALE

DATA AVVIO ATTIVITA': 31/03/2007

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA': 31/12/2007



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

WPO – MONITORAGGIO E CONTROLLO

Indice dei contenuti

1. OBIETTIVO	3
2. ATTIVITÀ SVOLTA	3
3. RISULTATI	4



1. Obiettivo

In linea con quanto ipotizzato sia in sede di definizione della progettazione esecutiva che in sede di redazione del Piano Dettagliato di Attuazione, obiettivo finale delle attività oggetto del WP0 è stato quello di monitorare lo svolgimento di tutte le operazioni di Progetto, anche attraverso la stretta collaborazione dei due partner – C.I.M.O. ASMD PUGLIA e CARDIO ON LINE EUROPE –, verificando il rispetto degli obiettivi generali dell'intero progetto e controllando la coerenza di quanto attuato, sia in termini di tempistica di realizzazione che in termini di congruità delle spese sostenute, rispetto a quelle ipotizzate in fase di progettazione.

2. Attività svolta

Le attività previste dal WP0, dato il loro particolare carattere di accompagnamento dell'intero Progetto, sono state avviate contestualmente all'avvio del Progetto ad aprile/2004.

Attuatore del WP0, proprio in funzione del compito di responsabile della realizzazione dell'intero Progetto derivante anche dal ruolo di capofila dell'Associazione Temporanea destinataria del contributo regionale e quindi quale sottoscrittore degli impegni con la Regione Puglia, è stato il Partner C.I.M.O. – ASMD PUGLIA –. Alle attività di cui al WP0 comunque, poiché relative anche al monitoraggio ed al controllo delle operazioni di cui è stato responsabile il Partner CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l., ha partecipato il personale interno a quest'ultimo fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie, per consentire al Partner C.I.M.O. di assolvere ai propri compiti di verifica e controllo. Per l'espletamento delle attività previste dal presente WP0, il Partner Contraente si è avvalso per l'intero periodo di realizzazione del Progetto della consulenza di specialistica della PROFIN SERVICE S.r.l. cui è stato affidato il servizio di "programme management" finalizzato all'assistenza della C.I.M.O. nelle attività di monitoraggio e controllo della corretta esecuzione delle varie fasi.

Nel concreto l'attività ha riguardato, dapprima la definizione del Progetto Esecutivo. Partendo dall'analisi della proposta progettuale, in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia ed in stretta collaborazione con il Partner realizzatore – CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l. –, è stato elaborato il documento definitivo di progettazione esecutiva che è stato presentato presso i competenti organi regionali.

Ottenuta l'approvazione del Progetto Esecutivo, l'attività della C.I.M.O., coadiuvata dalla PROFIN SERVICE, si è concentrata sulla formalizzazione degli adempimenti richiesti dalla stessa Regione Puglia, (costituzione dell'Associazione temporanea di Scopo e sottoscrizione della Convenzione), e sulla definizione degli atti utili all'individuazione delle altre competenze e professionalità necessarie per la realizzazione di tutte le attività progettuali. La C.I.M.O. ha provveduto, infatti, ad individuare nella società "EMMEFFE CONSULTING S.a.s. di Francesco Mastroilli", il soggetto cui affidare la realizzazione delle attività previste dal WP1, consistenti nella definizione dei criteri per attuare la selezione delle imprese da far partecipare alla



sperimentazione del progetto.

Completate le predette operazioni, consistenti sostanzialmente in attività di start-up del Progetto, ed ultimati gli adempimenti formali preliminari richiesti dalla Regione Puglia, si è potuto procedere con il materiale avvio delle attività progettuali.

Con riferimento alle specifiche responsabilità di “contraente”, la C.I.M.O. provveduto ad elaborare e trasmettere, anche attraverso la verifica e successiva integrazione di quanto redatto dal Partner CARDIO ON LINE EUROPE per le attività di sua competenza, i Piani Dettagliati di Attuazione di ciascun WP, le Relazioni Quadrimestrali di SAL, le richieste di erogazione del contributo spettante sia a titolo di anticipazione che a titolo di Stato Avanzamento Lavori e quant’altro specificatamente richiesto anche dagli organi di controllo nel corso del periodo di realizzazione del Progetto.

Come previsto dal Progetto Esecutivo e del successivo Piano Dettagliato di Attuazione del WP0, infine, sempre in funzione delle sue responsabilità di controllo, per tutto il periodo di realizzazione del Progetto la C.I.M.O. ha svolto, direttamente e con l’ausilio del consulente incaricato, l’attività di verifica e monitoraggio in merito all’andamento del Progetto al fine di garantire sia il conseguimento degli obiettivi progettuali che il rispetto delle procedure di realizzazione delle attività e sostenimento delle spese, indicate dalla Regione in conformità ai contenuti dei Regolamenti Comunitari richiamati.

3. Risultati

Sotto-attività WP0 - 0.1: Management generale progetto con competenze organizzative, tecniche e scientifiche

Conformemente alla progettazione esecutiva ed a quanto indicato nel Piano Dettagliato di Attuazione l’intero WP0 è composto da una sola sotto-attività.

Poiché le attività del presente WP0 sono state realizzate in sostanziale conformità rispetto alle previsioni, si conferma che i risultati raggiunti sono rappresentati, dal documento definitivo di progettazione esecutiva, dai documenti periodici di monitoraggio delle attività realizzate, dalla documentazione e reportistica relativa alle spese sostenute e dalla corrispondenza connessa con le richieste di proroga della tempistica di realizzazione delle varie operazioni in cui era suddiviso il Progetto.

Di seguito, dunque, si riporta un elenco della documentazione prodotta nell’ambito del presente WP0, che sostanzialmente sintetizza l’attività di gestione e monitoraggio del Progetto oltre all’attività di controllo delle attività effettuate e delle spese sostenute direttamente dal Partner contraente – C.I.M.O. - ASMD PUGLIA – e dal Partner realizzatore – CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l. –.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Documento di Progettazione Esecutiva;
- ⇒ Nota integrativa al Progetto Esecutivo relativa alla variazione della campagne dell’associazione Temporanea di Scopo con allegate tabelle finanziarie aggiornate;



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

- ⇒ Piano Dettagliato di Attuazione del WP0 – “Monitoraggio e Controllo”;
- ⇒ Piano Dettagliato di Attuazione del WP1 – “Analisi dei fabbisogni informativi delle imprese pugliesi”;
- ⇒ Piano Dettagliato di Attuazione del WP2 – “Creazione infrastruttura piattaforma telematica e-Salute e portale Work-Care”;
- ⇒ Piano Dettagliato di Attuazione del WP3 – “Integrazione piattaforma fra gli elementi funzionali del Progetto”;
- ⇒ Piano Dettagliato di Attuazione del WP4 – “Comunicazione e divulgazione dei risultati”;
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (I° - II° - III° dal 01/04/2004 al 31/03/2005);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (IV° dal 01/04/2005 al 31/07/2005);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (V° dal 01/08/2005 al 30/11/2005);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (I° - II° - III° dal 01/04/2004 al 31/03/2005);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (VI° dal 01/12/2005 al 31/03/2006);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (VII° dal 01/04/2006 al 31/07/2006);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (VIII° dal 01/08/2006 al 30/11/2006);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (IX° dal 01/12/2006 al 31/03/2007);
- ⇒ Relazione Quadrimestrale di SAL (X° dal 01/04/2007 al 31/07/2007);
- ⇒ Relazione Finale (dal 01/08/2007 al 31/12/2007);
- ⇒ Richiesta di erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione;
- ⇒ Richiesta di erogazione della seconda quota di contributo a titolo di S.A.L per spese sostenute nel periodo 01/04/2005 -31/03/2005;
- ⇒ Richiesta di erogazione della terza quota di contributo a titolo di S.A.L per spese sostenute nel periodo 01/04/2005 -31/11/2006;
- ⇒ Richiesta di erogazione della quarta quota di contributo a titolo di S.A.L per spese sostenute nel periodo 01/08/2006 -15/09/2007;
- ⇒ Richiesta di erogazione del saldo del contributo a titolo di S.A.L per spese sostenute nel periodo 16/09/2007 -31/12/2007;
- ⇒ Richiesta di concessione di proroga di sei mesi per l’ultimazione del Progetto, presentata in data 31/10/2006;
- ⇒ Richiesta di concessione di ulteriore proroga di tre mesi per l’ultimazione del Progetto, presentata in data 11/09/2007.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

WP1 – ANALISI FABBISOGNI INFORMATIVI IMPRESE PUGLIESI

Indice dei contenuti

1. OBIETTIVO	7
2. ATTIVITÀ SVOLTA	7
3. RISULTATI	9



1. Obiettivo

Conformemente a quanto previsto dal Progetto Esecutivo prima e dal Piano Dettaglio di Attuazione poi, l'obiettivo finale del WP1 - ANALISI FABBISOGNI INFORMATIVI IMPRESE PUGLIESI, è stato quello di individuare un campione di 150 imprese, il più possibile rappresentativo della realtà economico-produttiva della Regione Puglia, nelle quali allocare i "kit e-salute" al fine di attuare le attività di sperimentazione dei servizi di telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive.

2. Attività svolta

Le attività previste dal WP1 sono state avviate ad aprile/2004 in leggero ritardo rispetto alla previsione del Progetto Esecutivo e del successivo Piano di Attuazione. Responsabili dell'attuazione delle attività sono entrambi i Partner con compiti e specificità diverse.

Il Partner Proponente – C.I.M.O. ASMD –, ha dapprima avviato una serie di incontri tecnico alle quali hanno partecipato sia il Dott. Addante, allora Rappresentante Legale dell'Associazione, che il Dott. Amoroso, Responsabile Tecnico del Progetto per la stessa Associazione, oltre al consulente della Società EMMEFFE CONSULTING, società incaricata dalla stessa Associazione di curare le attività di analisi "qualitativa" e "quantitativa" connesse all'individuazione del campione di imprese da coinvolgere nelle fasi di sperimentazione dei servizi previsti dal Progetto "626 NET".

Detti incontri, finalizzati alla definizione di una serie di criteri per l'individuazione di imprese aventi caratteristiche in più possibile rispondenti alle esigenze di sperimentazione, hanno fornito al consulente incaricato le indicazioni e gli strumenti da seguire per giungere alla costituzione del campione di imprese che ha formato il network di sperimentazione dei servizi di telemedicina on-line.

Nell'ambito di tale attività, molteplici sono state intraprese:

- raccolta informazioni in merito alle componenti scientifiche di maggior rilievo da considerare nella definizione dei criteri di scelta delle imprese, al fine di poter meglio definire il campione di aziende;
- predisposizione di materiale informativo-divulgativo per favorire la conoscenza del progetto presso il mondo delle imprese;
- organizzazione di seminari di approfondimento presso le principali sedi delle Associazioni di categoria interessate;
- predisposizione di questionari e di modelli di report delle informazioni rivenienti dagli stessi, al fine di poter giungere alla stesura di un elenco-campione di imprese da sensibilizzare ulteriormente.

Le azioni descritte ed i prodotti realizzati trovano riscontro nello studio predisposto dalla EMMEFFE CONSULTING S.a.s.

Alla definizione del gruppo di imprese, dunque, si è giunto in maniera graduale partendo da un preliminare esame "qualitativo" delle imprese pugliesi che ha poi portato alla definizione di un insieme di criteri da applicare per l'individuazione di un congruo numero di operatori economici aventi caratteristiche utili a consentire le attività di sperimentazione.



Tale primo campione, composto da n. 500 aziende pugliesi e definito anche attraverso l'invio questionari e richieste di manifestazione di interesse, è stato poi oggetto di un'ulteriore analisi che attraverso l'applicazione di criteri di selezione ha portato alla definizione del campione da sottoporre alla sperimentazione dei servizi.

Anche il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, è stato interessato dalle attività iniziali previste dal WP1. In qualità di realizzatore degli interventi materiali, ha provveduto ad effettuare una formale indagine di mercato per la scelta del fornitore della piattaforma telematica e dei kit e-Salute e successivamente ad acquistare, dal fornitore DEL VECCHIO & PARTNERS, tutte le componenti per l'assemblaggio dei 150 kit da installare presso il network di imprese aderenti alla sperimentazione, e le componenti hardware per la realizzazione della "piattaforma tecnologica" necessaria per l'erogazione dei servizi di telemedicina on-line.

Dette dotazioni informatiche acquisite da CARDIO ON LINE EUROPE, risultano sostanzialmente conformi a quelle progettate ed individuate di fase di progettazione esecutiva. Alcune analisi tecniche effettuate dallo stesso Partner nella fase attuativa del Progetto, e specificatamente dopo l'avvio delle attività di sperimentazione, hanno evidenziato la necessità di procedere con un upgrade del sistema di videocomunicazione al fine di aggiornare il sistema, sia per potenziarne le funzionalità che per integrarlo con le più recenti soluzioni informatiche.

Superata la prima fase di avvio e completata l'individuazione delle 150 imprese aderenti all'iniziativa, lo stesso anche attraverso il proprio personale interno ha proceduto con:

- la raccolta della manifestazione di interesse da parte delle imprese aderenti;
- la definizione del contratto di comodato per la consegna ed installazione del kit e-salute e l'erogazione dei servizi di telemedicina on-line;
- l'installazione del kit e-salute e, l'avvio dell'attività di sperimentazione.

Relativamente alla fase di installazione dei kit, il Partner CARDIO ON LINE EUROPE ha incontrato le uniche criticità rilevate nell'ambito del WP1. Alcune imprese inizialmente aderenti al Progetto, infatti, nella fase di consegna degli stessi kit ha ritirato la propria disponibilità, costringendo il Partner dapprima a ritardare il completamento del network e successivamente a procedere con la sostituzione di tali imprese. Il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, ha pertanto provveduto ad una rimodulazione del campione in base alla quale, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti nell'ambito dell'attività WP1 - "Analisi fabbisogni informativi imprese pugliesi", è stata consentita la partecipazione all'attività di sperimentazioni anche ad imprese operanti in altri settori, in particolare quello turistico, in quanto dette imprese sono ugualmente rappresentative degli ambiti produttivi regionali e soprattutto hanno consentito il raggiungimento di una utenza molto ampia (basti pensare agli addetti ed agli ospiti di una struttura ricettiva nel periodo estivo) e conseguente hanno portato ad un aumento dei dati statistici sui quali poter meglio effettuare i riscontri rispetto agli obiettivi progettuali. E' stata, raggiunto un'intesa con il COTUP, consorzio pugliese che raggruppa gli operatori turistici, in base al quale lo stesso ha segnalato le strutture ricettive presso le quali allocare i restanti kit necessari a completare il campione.

Le operazioni di consegna ed installazione, avviate nel mese di giugno/2005 a causa della criticità descritta sono state ultimate solo nel mese di aprile/2007.

La criticità sopra descritta, comunque, non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi del WP e dell'intero Progetto. Infatti, nelle more del completamento



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

delle installazioni dei kit presso il campione di imprese, sin da gennaio/2006 di comune accordo tra i due Partner si è deciso di avviare le attività di sperimentazione dei servizi al fine di garantire un periodo adeguatamente lungo per ottenere sufficienti dati ed informazioni utili all'analisi ed alla valutazione dei servizi di telemedicina on-line erogato a favore delle imprese.

3. Risultati

Sotto-attività WP1 - 1.1 – Esame quantitativo imprese pugliesi

Il risultato principale della sotto-attività WP1 - 1.1, in conformità a quanto previsto in fase di progettazione esecutivo è rappresentato dallo "studio di mercato" redatto su incarico del Partner Contraente dalla EMMEFFE CONSULTING S.a.s, nel quale è contenuto il "sistema di criteri" da applicare per arrivare alla definizione del campione di imprese da coinvolgere nelle attività di sperimentazione previste dal Progetto. Lo studio peraltro, descrive l'iter seguito e le attività svolte per giungere a tale risultato finale elencando anche l'insieme degli strumenti ed elaborati prodotti nell'ambito di tale attività.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Studio di Mercato;
- ⇒ Campione iniziale delle imprese pugliesi (n. 500);
- ⇒ Fac-simile della Nota di presentazione dell'iniziativa completo di questionari e richiesta di manifestazione di interesse.

Sotto-attività WP1 - 1.2 – Approfondimento qualitativo imprese pugliesi

Nell'ambito della sotto-attività WP1 – 1.2, un primo risultato è stato rappresentato dall'iniziale campione di imprese pugliesi (500), alle quali sono state inviate le note di presentazione dell'iniziativa complete di questionario e richiesta di manifestazione di interesse ad approfondire i dettagli del Progetto.

Tale iniziale campione, verificate le manifestazioni di interesse pervenute delle imprese, è stato analizzato in base al sistema di criteri così come definiti nell'ambito della precedente sotto-attività, giungendo così al definitivo elenco di 150 imprese presso le quali eseguite l'attività di sperimentazione.

Come indicato nel precedente paragrafo 2 - Attività svolta, tale elenco è stato oggetto di una rimodulazione, in quanto parte delle imprese inizialmente aderenti alla sperimentazione non si sono rese disponibili per le fasi di installazione dei kit. Nell'ambito dell'iniziale elenco di 150 imprese, dunque, sono state sostituite circa trenta imprese con quelle segnalate dal COTUP.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Questionari e manifestazione di interesse inviate dalle imprese aderenti;
- ⇒ Fac-simile del contratto di comodato delle apparecchiature;
- ⇒ Fac-simile del contratto di erogazione dei servizi di telemedicina on line;
- ⇒ Campione definitivo delle 150 imprese presso le quali sono stati allocati i kit e-salute;



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

Sotto-attività WP1 - 1.3 – Individuazione imprese pilota e messa a disposizione “kit e-salute”

La conclusiva sotto-attività del WP1, ha prodotto come materiale risultato l’installazione dei kit e-salute nelle 150 imprese oggetto della sperimentazione.

Con dette imprese si è provveduto a sottoscrivere appositi contratti di comodato delle apparecchiature del kit e-salute e contratti di erogazione dei servizi di telemedicina on-line.

Nell’ambito della presente sotto-attività, inoltre, un ulteriore risultato è rappresentato dall’acquisizione dei kit e-salute e dell’insieme delle componenti hardware necessarie alla realizzazione della piattaforma telematica.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Contratto di comodato delle apparecchiature e Contratto di erogazione dei servizi di telemedicina on-line sottoscritti con le imprese aderenti;
- ⇒ Relazione tecnica di avvenuta consegna, installazione e testing del kit e-salute, completo di documento di trasporto delle apparecchiature.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

WP2 – CREAZIONE INFRASTRUTTURA PIATTAFORMA TELEMATICA @-SALUTE E PORTALE WORK-CARE

Indice dei contenuti

1. OBIETTIVO	12
2. ATTIVITÀ SVOLTA	13
3. RISULTATI.....	15



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

1. Obiettivo

Con riferimento all'intero Progetto, gli obiettivi del presente Work-Package WP2, rappresentano quelli più propriamente materiali.

In linea con quanto ipotizzato in sede di progettazione degli interventi, infatti, obiettivo principale delle attività inserite nel WP2 è stato quello di realizzare la piattaforma telematica denominata "@-Salute", sulla quale poggiano tutti i servizi di telemedicina sperimentati nel periodo di realizzazione del Progetto 626NET, erogabili nella fase di mantenimento del Progetto stesso, e successivamente potenziabili e fruibili da parte di tutte le imprese pugliesi interessate alla prevenzione, tutela e miglioramento della salute nei luoghi di lavoro.

L'intero WP, conformemente a quanto previsto dalla progettazione esecutiva e dal successivo Piano Dettagliato di Attuazione, è stato suddiviso in tre sotto-attività, delle quali le prime due riguardanti la fattibilità, la progettazione e la realizzazione della piattaforma telematica e pertanto indipendenti dagli altri WP previsti dal Progetto, mentre la terza finalizzata all'attivazione del campione di imprese aderenti all'attività di sperimentazione dei servizi di telemedicina oltre che alla fase di sperimentazione stessa dei predetti servizi. È evidente che la realizzazione di tale ultima sotto-attività è stata fortemente condizionata, in termini di tempistica di ultimazione, dalle difficoltà di completamento del campione di imprese di cui al precedente WP1 – Sotto-attività WP1 – 1.3.

Responsabile unico delle attività inserite nel WP2 è stato il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, che ha provveduto alla realizzazione delle stesse utilizzando:

- il proprio personale interno distaccato alle attività di progetto;
- il proprio fornitore tecnologico DEL VECCHIO & PARTNERS che oltre ad aver prestato la propria consulenza tecnica nella fase di sperimentazione dei servizi, ha fornito le componenti hardware (*server, postazioni client, sistema videocomunicazione*) per la materiale realizzazione della piattaforma telematica e le relative licenze (*software applicativo cardiologia e monitoraggio MPM; Licenze postazioni; Moduli per gestione piattaforma telematica*) per l'erogazione dei servizi;
- un gruppo di specialisti specializzati nella "tele-lettura" dei dati che attraverso i diversi strumenti che compongono il kit @-Salute, installato presso ciascuna delle 150 imprese facenti parte del campione oggetto della sperimentazione, le imprese, attraverso il collegamento garantito dalla piattaforma telematica, comunicano alla centrale operativa. Ciascun "valore" comunicato, è stato analizzato e valutato dalle figure mediche, le quali hanno di volta in volta disposto con immediatezza l'eventuale intervento da attuare. L'insieme di tutti gli interventi effettuati dal gruppo di specialisti nell'intero periodo di sperimentazione, poi, nell'ambito delle attività di cui al successivo WP3, è stato oggetto di ulteriore analisi statistica ed attività di sintesi da parte delle professionalità individuate dai due Partner, che ha portato alla standardizzazione in apposite Linee Guida Operative di procedure ed operazioni, utili alla migliore fruizione dei servizi di telemedicina realizzati dal Progetto 626NET.



2. Attività svolta

Le attività previste dal presente WP2, sono state avviate a metà 2004 con un leggero ritardo rispetto alla tempistica ipotizzata nel Piano Dettagliato di Attuazione, sostanzialmente a causa della procedura utilizzata dal Partner CARDIO ON LINE EUROPE – responsabile dell’attuazione del Work-Package –, per l’individuazione del soggetto fornitore dei servizi, degli hardware e software necessari alla realizzazione delle diverse sotto-attività del WP2.

Data la massima importanza che la fornitura finalizzata alla realizzazione della “piattaforma telematica” rappresenta rispetto all’intero Progetto, il Partner ha prestato particolare impegno nella fase di individuazione del soggetto più idoneo e qualificato. Con apposita procedura assimilabile alla trattativa privata così come prevista dall’art. 7 del D. Lgs. 157/95, è stato individuato nell’impresa - “DEL VECCHIO & PARTNERS” con sede in Bergamo – il fornitore sia delle infrastrutture, che delle licenze d’uso previste, così come definite dal Progetto Esecutivo. Avendone dimostrato le competenze, inoltre, allo stesso fornitore è stato affidato anche l’incarico di affiancamento del Partner nella fase di predisposizione della progettazione esecutiva, relativamente alla realizzazione della piattaforma telematica “@-Salute”.

La prima sotto-attività WP2 – 2.1, è stata completata nei primi mesi di esecuzione del WP, con la definizione dei requisiti di fattibilità che hanno portato all’individuazione delle principali caratteristiche tecnologiche e funzionali di cui sia la piattaforma telematica che il portale dovevano essere dotati per poter garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto. Il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, poiché, nell’esecuzione di tali attività ha preferito puntualizzare ed integrare l’analisi con la successiva progettazione, ritenendo le due attività strettamente dipendenti l’una dall’altra, è giunto nell’ambito della stessa sotto-attività WP2 – 2.1, alla predisposizione della Progetto Esecutivo realizzando un unico documento integrato, propedeutico alla successiva fase di acquisizione delle varie componenti infrastrutturali.

La seconda sotto-attività WP2 – 2.2, dunque, è stata finalizzata alla sola realizzazione della piattaforma telematica “@-Salute”. A tale attività hanno partecipato anche alcune professionalità mediche che hanno fornito consulenze scientifiche utili a definire meglio le caratteristiche di cui la piattaforma è stata dotata al fine di rispondere al meglio alle esigenze giunte dai soggetti che hanno fatto parte del network di imprese oggetto della sperimentazione.

Definite le prime due sotto-attività, dunque, contemporaneamente alla sotto-attività WP2 – 2.2, poiché ad agosto/2008 è stata già individuata l’impresa “DEL VECCHIO & PARTNERS” quale fornitrice delle componenti infrastrutturali, è stata anche formalmente avviata l’ultima sotto-attività del WP2.

Sono state effettuate, pertanto, le acquisizioni delle infrastrutture tecnologiche, delle reti di telecomunicazione e dei servizi di telecontrollo, rispettando il Progetto Esecutivo sia in termini di caratteristiche e dotazione delle componenti hardware che in termini di costo complessivo della piattaforma. Analogamente, sono state acquisite le licenze d’uso dei sistemi operativi della piattaforma applicativa e dei brevetti, sempre rispettando caratteristiche e costi individuati in sede di predisposizione del Progetto Esecutivo.

Tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 è stata definitivamente completata la realizzazione del Centro Operativo “@-Salute”, ossia la piattaforma telematica



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

grazie alla quale è possibile erogare tutti i servizi di telemedicina sviluppati nell'ambito del Progetto 626NET.

Completata l'infrastruttura tecnologia indispensabile per l'avvio dell'attività di sperimentazione, anche se come evidenziato nelle Relazione Quadrimestrali e nel relativo Rapporto Tecnico del WP1 il completamento del campione di 150 imprese che hanno partecipato alla sperimentazione dei servizi ha richiesto una maggiore tempistica, già dai primi mesi del 2006 il Partner CARDIO ON LINE EUROPE ha provveduto ad avviare le attività di sperimentazione di cui al WP2 -2.3 anche senza aver completato l'installazione dei "kit @-Salute" presso le imprese.

La volontà dei Partner di avviare comunque la sperimentazione, è dipesa sostanzialmente dalla necessità di mantenere adeguatamente lungo il periodo della stessa sperimentazione, così da poter censire ed analizzare il maggior numero possibile di casistiche.

Preliminarmente all'avvio della sperimentazione, dunque, il Partner esecutore CARDIO ON LINE EUROPE, ha avviato le operazioni di ricerca delle professionalità scientifiche, in particolare cardiologi, dotate di esperienze tali da garantire interventi e refertazioni competenti e puntuali specie in funzione del particolare servizio di "telemedicina" che si è fornito attraverso la sperimentazione. Le consulenze scientifiche, individuate sulla base dei curriculum acquisiti, sono state formalizzate attraverso appositi contratti nei quali sono stati stabiliti, sia in funzione delle previsioni economiche definite in fase di progettazione esecutiva che in funzione dei limiti posti nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia, compensi, tempi e modalità di espletamento delle attività consulenziali.

Con il completamento del campione di imprese e con il conseguente intensificarsi delle chiamate da parte delle imprese, il gruppo scientifico è stato gradualmente integrato.

Come previsto, la sperimentazione del servizio di "telemedicina" è partita da una prima serie di simulazioni su un campione di addetti per singola impresa, sia per testare il corretto funzionamento delle apparecchiature installate presso le imprese e nel Centro Operativo creato nella sede operativa della C.I.M.O., sia per verificare la capacità di accesso al servizio da parte delle figure addestrate presso le imprese. Completate le operazioni di testing, la sperimentazione è partita con le prime chiamate da parte delle imprese. I relativi interventi da parte dei professionisti presenti presso il Centro Operativo, sono stati regolarmente protocollati ed archiviati sui server che compongono la stessa infrastruttura realizzata.

Per lo svolgimento di attività di supporto alla sperimentazione, inoltre, il partner CARDIO ON LINE EUROPE ha provveduto ad affiancare alle professionalità specialistiche una propria figura interna, che si è occupata degli aspetti prettamente tecnici, organizzativi e di coordinamento con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficacia della stessa attività di sperimentazione. Tale figura è stata anche incaricata di provvedere alla predisposizione di appositi report e dati statistici degli interventi effettuati, materiale che è stato successivamente sottoposto all'attenzione del Comitato d'Indirizzo e del Gruppo di Coordinamento Operativo e che è stato utilizzato sia come base per le attività di "Integrazione della piattaforma fra gli elementi funzionali del Progetto" di cui al successivo WP3, che come materiale divulgativo dei risultati ottenuti, nell'ambito delle successive fasi di comunicazione dei risultati previste dal WP4 - COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI.

Con il definitivo completamento del campione di imprese, ed in funzione dell'ottenimento della proroga di sei mesi per la chiusura del Progetto, i Partner hanno ritenuto opportuno proseguire l'attività di sperimentazione fino a novembre/2007, sempre con l'obiettivo di ottenere la maggiore "mole" possibile di



dati, indispensabili per meglio raggiungere gli obiettivi previsti sia dalla presente Operazione WP2 che dall'intero Progetto, ritenendo proprio la "sperimentazione" l'elemento più qualificante dell'intero intervento.

Contemporaneamente alla sperimentazione dei servizi, nell'ambito del WP2 sono stati progressivamente integrati ed aggiornati i contenuti del Portale "Work-Care" sia dal punto di vista dell'accessibilità ai dati e servizi disponibili, che dal punto di vista dell'immagine dello stesso. Si è provveduto, pertanto, alla registrazione del dominio www.626net.com, indirizzo attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni ed ai servizi realizzati con il Progetto.

3. Risultati

Sotto-attività WP2 - 2.1: Analisi requisiti di fattibilità

Conformemente a quanto previsto in sede redazione del Piano Dettagliato di Attuazione del WP2, la sotto-attività Wp2 – 2.1 è stata finalizzata alla definizione del documento di analisi dei requisiti di fattibilità sia della piattaforma telematica "@Salute" che del Portale "Work-Care".

Come detto in precedenza, il Partner CARDIO ON LINE EUROPE nell'ambito della presente sotto-attività ha preferito integrare l'attività di analisi con la definizione della Progettazione Esecutiva, giungendo alla predisposizione di un unico documento "IPOTESI DI INFRASTRUTTURA - PIATTAFORMA TELEMATICA DI TEMEDICINA (IPT)", nel quale all'analisi delle caratteristiche tecnologiche e funzionali di cui dotare la piattaforma ed il portale al fine di garantire sia la corretta erogazione dei servizi di "telemedicina" realizzati con il Progetto, che l'immediata fruizione delle informazioni riguardanti le salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono dettagliate in maniera puntuale le varie componenti infrastrutturali necessarie alla realizzazione della stessa piattaforma tecnologica. I dettagli tecnici e le caratteristiche tecnologiche, che le diverse componenti del Centro Operativo e del Portale, dovevano possedere quali requisiti minimi sia in termini di hardware che software, elaborati nell'ambito del Progetto Esecutivo, sono stati ovviamente utilizzati dal Partner CARDIO ON LINE EUROPE nella procedura di individuazione del fornitore tecnologico.

Documentazione prodotta:

⇒ "IPOTESI DI INFRASTRUTTURA - PIATTAFORMA TELEMATICA DI TEMEDICINA (IPT)"

Sotto-attività WP2 - 2.2: Progettazione e realizzazione della piattaforma e creazione del portale

CARDIO ON LINE EUROPE, individuato il fornitore tecnologico e con l'ausilio di professionalità mediche coinvolte nella realizzazione del Progetto, utilizzando il documento contenente la Progettazione Esecutiva quale riferimento ha completato la materiale realizzazione della "piattaforma telematica" e del "portale". Relativamente alla prima, infatti, sono state contestualmente definite le acquisizioni dal fornitore "DEL VECCHIO & PARTNERS", delle diverse componenti hardware e software, oggetto della successiva sotto-attività WP2 – 2.3, giungendo alla definitiva ultimazione del Centro Operativo "@-Salute" a fine 2005.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

In relazione alla realizzazione del Portale, invece, nell'ambito della presente sotto-attività wp2 – 2.2, sono state realizzate operazioni di definizione, integrazione ed aggiornamento delle varie procedure e dei vari contenuti sia relativamente alle possibilità di fruizione dei servizi di telemedicina sviluppati che di accesso alle informazioni connesse sia con i risultati della sperimentazione e più in generale con i risultati dell'intero Progetto.


La materiale implementazione del Portale, che ha diversi up-grade prima di giungere alla versione definitiva, è stata effettuata nell'ambito delle attività previste dal successivo WP4 - COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI. Il relativo prodotto/risultato, dunque, è allegato al Rapporto Tecnico del WP4.

Sotto-attività WP2 - 2.3: Creazione del centro @-Salute e successivo start-up dei servizi in fase di sperimentazione

Validata la progettazione esecutiva realizzata nell'ambito del WP2 - 2.1, come peraltro già indicato in precedenza, si è provveduto nell'ambito della presente sotto-attività WP2 - 2.3, alle acquisizioni delle varie componenti necessarie alla materiale realizzazione del Centro Operativo "@-Salute".

Completata la realizzazione della piattaforma telematica presso la sede operativa del Partner C.I.M.O. – ASMD PUGLIA, che unitamente ai 150 "Kit @-Salute" acquisiti ed installati presso il campione di imprese completa la componente materiale del Progetto, è stato possibile avviare l'attività di sperimentazione dei servizi di "telemedicina", già all'inizio del 2006.

Preliminarmente all'avvio della sperimentazione, come precedentemente indicato, è stata effettuata un'attività di "testing" su un campione di addetti per singola impresa al fine di verificare sia il corretto funzionamento delle apparecchiature installate presso le imprese e presso il Centro Operativo, sia per riscontrare la capacità di accesso al servizio da parte delle figure addestrate presso le imprese. Il grafico seguente riporta una sintesi delle predette simulazioni.

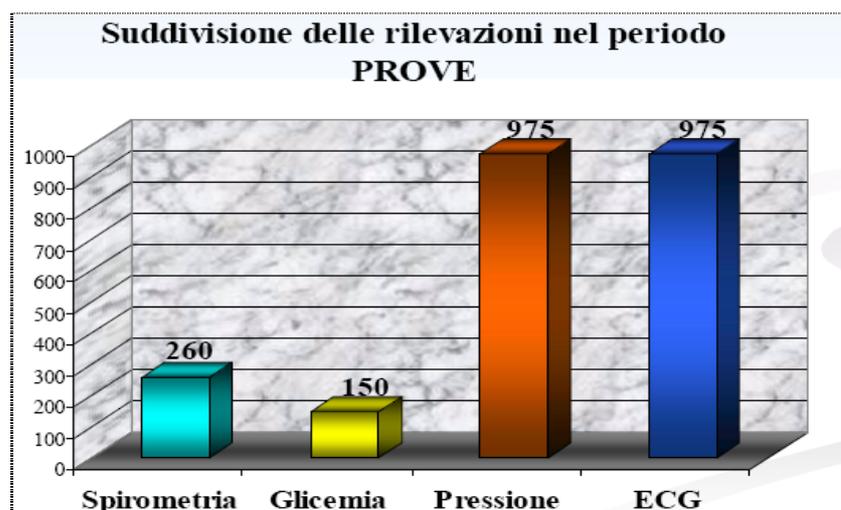




UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

L'architettura tecnologica così completata attraverso le varie componenti hardware e software, centrali e periferiche, dunque, consente l'erogazione di servizi specialisti on-line 24h su 24h quali telecardiologia, telemetria pressoria, telespirometria, teleglicemia, oltre alla possibilità di accedere a servizi di video consulto medico.

Le schematizzazioni successive riportano da una parte, la descrizione dei servizi on-line erogabili attraverso l'infrastruttura e dall'altra una rappresentazione delle attrezzature installate in comodato gratuito presso le imprese (*spirometro, sfigmomanometri, cardiotelefono, glucometro, apparecchio per videoconferenza*), e la struttura del Centro Operativo "@-Salute", con l'indicazione dei flussi e delle procedure di erogazione dei predetti servizi.

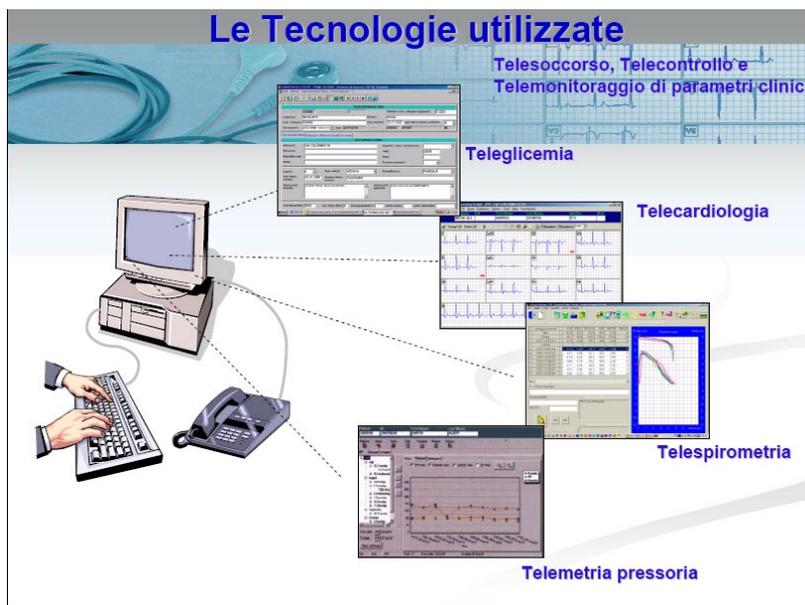





UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

Risultati della sotto-attività WP2 - 2.3, sono rappresentati principalmente dai dati acquisiti attraverso la sperimentazione dei predetti servizi presso il network di 150 imprese che compongono il campione rappresentativo delle realtà produttive pugliesi, che oltre ad essere stati sintetizzati in appositi report (*intermedi e finali*) sono stati opportunamente archiviati in un database presso lo stesso Centro Operativo, contenente le informazioni sensibili di ogni intervento effettuato nell'intero periodo di sperimentazione. A riguardo, a titolo dimostrativo si riportano di seguito alcune delle "refertazioni" effettuate.

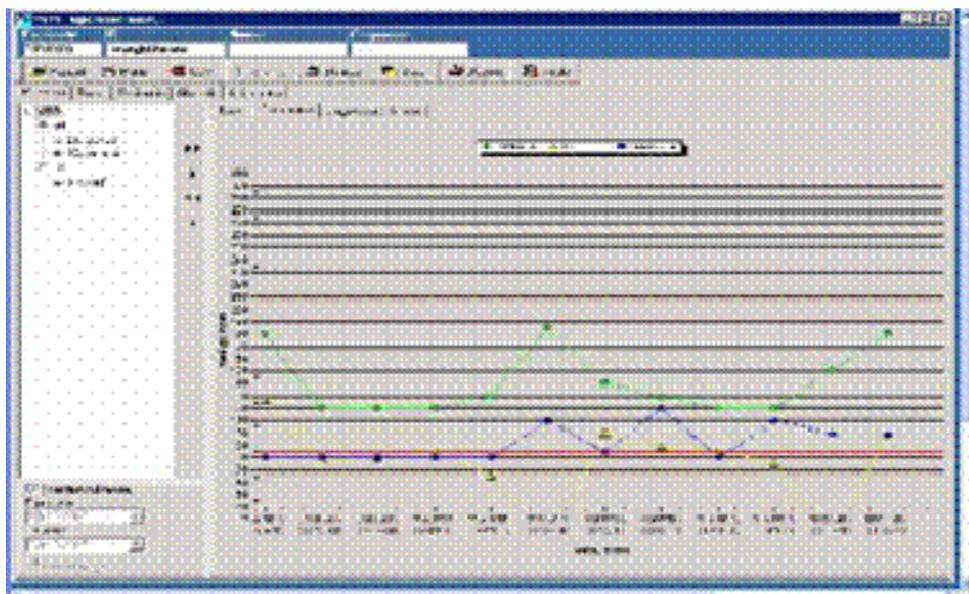
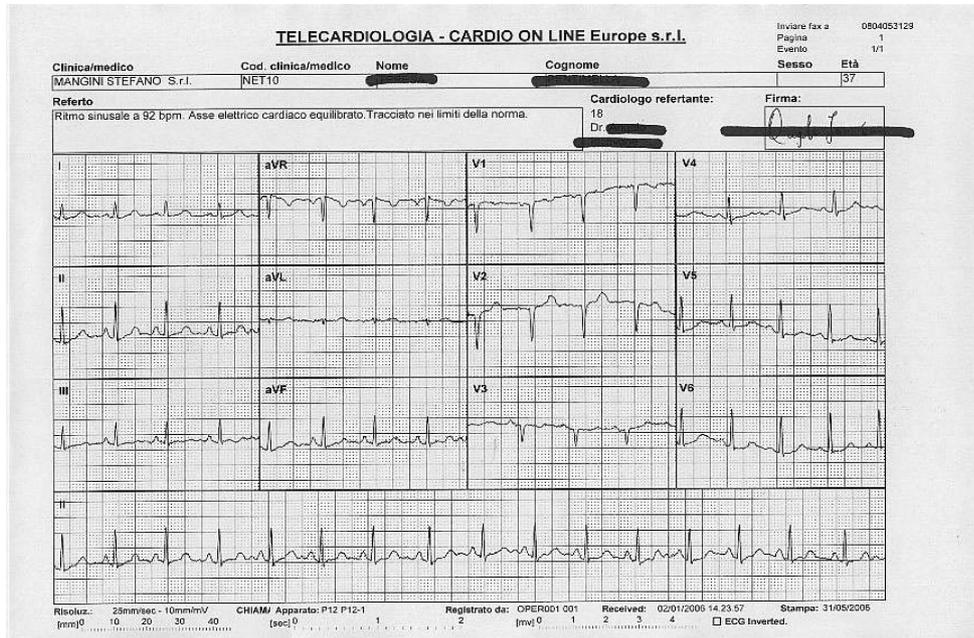




UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

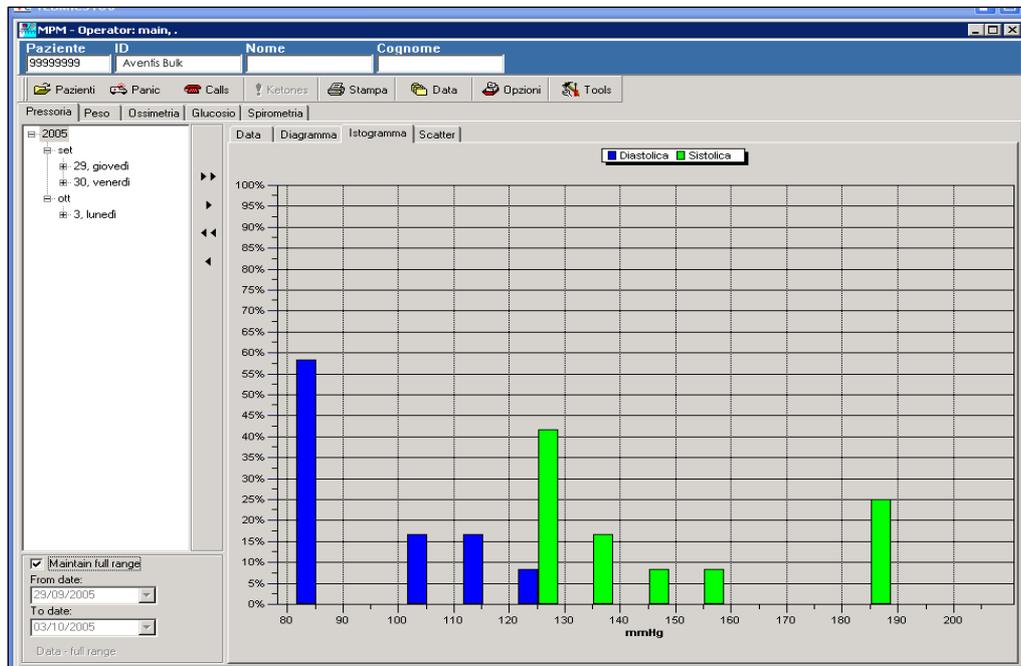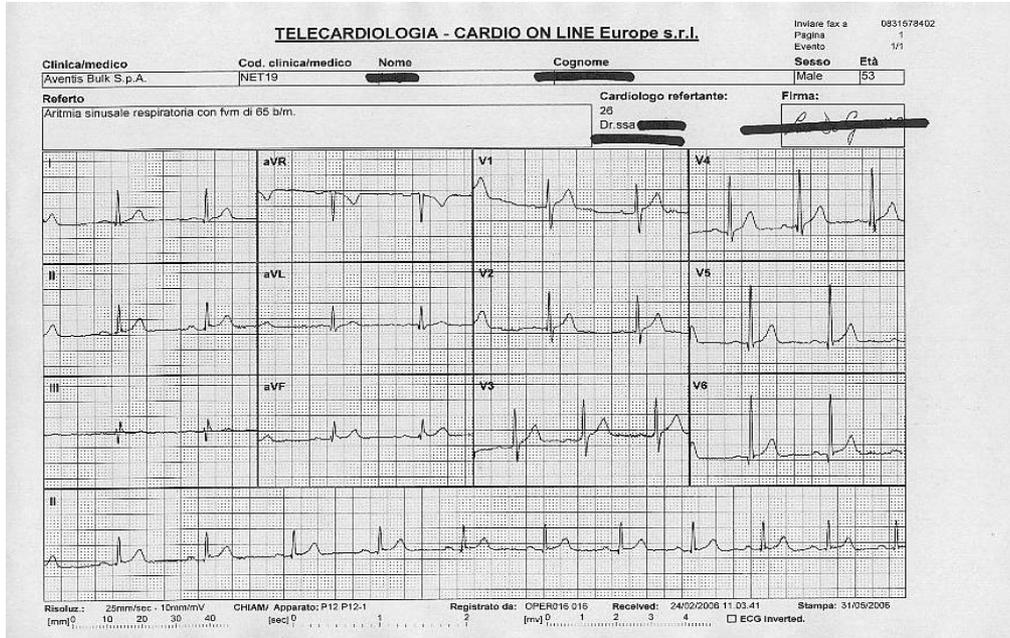



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

WP3 – INTEGRAZIONE PIATTAFORMA FRA GLI ELEMENTI FUNZIONALI DEL PROGETTO

Indice dei contenuti

1. OBIETTIVO	22
2. ATTIVITÀ SVOLTA	22
3. RISULTATI.....	23



1. Obiettivo

L'obiettivo, ipotizzato e raggiunto, con il presente Work-Package è stato sostanzialmente quello di fornire supporto all'attività di coordinamento tecnico-scientifica di tutte le operazioni connesse con la sperimentazione dei servizi di telemedicina. Nell'ambito di tale attività, infatti, entrambi i Partner ma principalmente il Partner CARDIO ON LINE EUROPE hanno provveduto, attraverso proprio personale tecnico interno ed attraverso il ricorso a consulenze specialistiche, ad eseguire continue verifiche e conseguentemente ad implementare le necessarie procedure finalizzate al superamento delle criticità funzionali che sono emerse nella fase di sperimentazione di cui al WP2.

L'insieme delle procedure implementate, dunque, sono state sintetizzate in appositi Manuali Operativi/Linee Guida Operative utili per le diverse figure (consulenti medici, teleoperatori, addetti all'assistenza tecnica ed utenti dei servizi) coinvolte nella fornitura e fruizione dei servizi di telemedicina erogabili attraverso le infrastrutture realizzate e sperimentate con il presente Progetto.

Le predette procedure, grazie al sufficiente periodo di sperimentazione attuato che volutamente i Partner hanno prorogato fino a novembre/2007 ed al congruo campione di imprese coinvolte, hanno consentito il riscontro di molteplici casistiche che hanno portato ad una standardizzare ottimale dei contenuti dei Manuali Operativi/Linee Guida Operative, che rappresentano dunque, uno strumento fondamentale per la futura erogazione dei servizi di telemedicina.

2. Attività svolta

Data la stretta dipendenza delle attività del presente WP3 con il precedente WP2, l'avvio delle relative attività ha subito un ritardo rispetto alla tempistica prevista, sostanzialmente dipendente sia dal ritardo nel completamento della piattaforma telematica che nel conseguente avvio della sperimentazione dei servizi presso il campione di imprese.

Il WP3 è caratterizzato dalla suddivisione in una prima sotto-attività WP3.1 che ha riguardato sostanzialmente il coordinamento delle altre tre sotto-attività che a partire da giugno/2005 sono state progressivamente avviate per poi essere concluse contestualmente a dicembre/2007.

Il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, maggiormente responsabile dell'attuazione del WP3, ha avviato l'attività procedendo alla definizione delle specializzazioni e competenze che le figure coinvolte dovevano garantire nello svolgimento delle diverse operazioni previste dalle sotto-attività in cui è suddiviso lo stesso WP3. Per ognuna delle tre sotto-attività (WP3.1.1 – WP3.1.2 – WP3.1.3) si prevedeva di individuare una o più figure professionali che, collaborando con i componenti del Comitato di Indirizzo e del Gruppo di Coordinamento Operativo, giungessero alla definizione dei Manuali Operativi/Linee Guida Operative.

Il prolungarsi delle attività di realizzazione della piattaforma telematica ed il conseguente ritardo dell'avvio delle attività di sperimentazione, ha provocato per alcuni mesi un sostanziale blocco del presente WP3.

Completata la realizzazione della piattaforma telematica a fine 2005, avviata l'attività di sperimentazione presso il campione di imprese nei primi mesi del 2006, avendo i Partner individuato le professionalità che hanno supportato i componenti



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

del Comitato di Indirizzo e del Gruppo di Coordinamento Operativo e data la disponibilità di una sufficiente quantità di informazioni derivanti dall'attività di sperimentazione, nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2006 è stato possibile avviare concretamente le operazioni finalizzate all'attività di "Integrazione Piattaforma fra gli elementi funzionali del Progetto".

La EMMEFFE CONSULTING per il Partner C.I.M.O. e la DEL VECCHIO & PARTNERS per il Partner CARDIO ON LINE EUROPE hanno, infatti, avviato, ciascuno per le proprie competenze, l'analisi dei dati e delle statistiche raccolte attraverso l'attività di sperimentazione.

Nel corso dei successivi quadrimestri di attività, poi, con la disponibilità di dati ed informazioni sempre maggiori derivanti dell'attività di sperimentazione, sono stati via via effettuate variazioni ed integrazioni delle bozze delle Linee Guida Operative che tenevano conto anche delle indicazioni provenienti sia dai Partner che dalle figure "tecniche" individuate dagli stessi.

La stretta correlazione tra le attività del presente WP3 e quelle del precedente WP2, già evidenziate in precedenza, stante la richiesta di proroga delle attività progettuali richiesta ed ottenuta fino alla fine del 2007, dovuta in gran parte alla necessità di disporre del maggior tempo possibile per la realizzazione dell'attività di sperimentazione, ha determinato lo slittamento dell'ultimazione del WP3 a fine 2007. Completata a Novembre/2007 la sperimentazione dei servizi di telemedicina presso il campione di 150 imprese, il Partner CIMO-ASMD PUGLIA con l'ausilio delle professionalità specialistiche dallo stesso individuate – EMMEFFE CONSULTING –, ed il Partner CARDIO ON LINE EUROPE anch'esso con l'ausilio delle professionalità individuate – DEL VECCHIO & PARTNERS – ed attraverso il proprio personale interno incaricato delle attività di supporto, elaborazione ed editing, hanno completato nel mese di dicembre/2007 le attività del WP3.

Si è provveduto, infatti, dapprima a sintetizzare le informazioni derivanti dall'attività di sperimentazione, poi sono state elaborate le casistiche più significative integrando ove necessario i diversi elementi funzionali della piattaforma telematica (*kit e-salute, centrale operativa e portale Work.Care www.626net.com*) che supportano e consentono l'erogazione dei servizi di telemedicina, ed infine sono stati definitivamente verificati ed aggiornati i contenuti delle "LINEE GUIDA OPERATIVE", che saranno utilizzati come guide alla fruizione dei servizi di telemedicina erogati nel periodo di mantenimento del Progetto, successivo all'ultimazione degli investimenti.

3. Risultati

Come precedentemente riportato il presente WP3 è suddiviso in quattro sotto-attività di cui la prima – WP3 - 3.1 – è stata finalizzata ad attività di coordinamento e monitoraggio delle altre tre sotto-attività che invece, sono state finalizzate alla definizione delle Linee Guida Operative per l'accesso ai servizi di telemedicina erogabili sia attraverso il kit e-salute che attraverso la videoconferenza a diversi livelli.

La prima sotto-attività, poiché, caratterizzata da operazioni meramente immateriali non prevedeva un vero e proprio risultato/prodotto, che sostanzialmente era dato dai prodotti delle altre tre sotto-attività, le quali conformemente a quanto previsto in fase di Progettazione Esecutiva prima, ed in sede di definizione dei Piani Dettagliati di Attuazione dopo, sono state concluse con la realizzazione dei



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

Manuali Operativi/Linee Guida Operative relativi alla “procedure” che le diverse figure coinvolte nell’erogazione e fruizione dei servizi di telemedicina utilizzeranno come guida.

Documentazione prodotta:

- ⇒ LINEE GUIDA OPERATIVE – Servizi di telecardiologia
- ⇒ GUIDA OPERATIVA – Sistema di videoconferenza



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

WP4 – COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Indice dei contenuti

1. OBIETTIVO	26
2. ATTIVITÀ SVOLTA	26
3. RISULTATI	29



1. Obiettivo

Obiettivo del WP4 è stato sostanzialmente quello di porre in atto una serie di azioni finalizzate alla più efficace comunicazione e divulgazione dei risultati raggiunti con la realizzazione del Progetto "626 NET: La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive".

Nella realizzazione delle predette attività sono stati interessati entrambi i Partner, i quali direttamente e con il ricorso a consulenze esterne dotate delle opportune conoscenze tecniche, scientifiche e di marketing, hanno progettato e realizzato un'attività di comunicazione estremamente diretta ed efficace.

Le operazioni previste dal presente WP4, dunque, sono state attuate in sostanziale coerenza con quanto preventivato in sede di progettazione esecutiva prima, ed in fase di definizione del Piano Dettagliato di Attuazione poi, salvo alcune necessarie variazioni dipendenti, in parte dalla effettiva tempistica di realizzazione delle operazioni previste dagli altri WP che necessariamente hanno condizionato l'attività di comunicazione – come ad esempio il ritardo nell'avvio delle attività di sperimentazione dovuto alle difficoltà nel completamento del campione di imprese oggetto della stessa sperimentazione (WP1) –, ed in parte dalla necessità di realizzare dette operazioni di comunicazione anche attraverso strumenti innovativi e multimediali come CD-ROM e sito Internet.

2. Attività svolta

Le attività oggetto del WP4 sono state avviate a giugno 2005, in leggero ritardo rispetto alle previsioni, in quanto nella fase iniziale di avvio del Progetto l'attenzione dei Partner si è concentrata sulle operazioni più strettamente operative e sulla definizione dei contenuti del Progetto stesso.

Prima attività, dunque, è stata quella di valutare la possibilità di individuare uno o più soggetti cui eventualmente affidare la definizione di un vero e proprio "Piano di Comunicazione" capace di raggiungere al meglio gli obiettivi di divulgazione e diffusione dei risultati.

Contestualmente è stata avviata la sotto-attività WP4 - 4.2 "Report intermedio con i dati di sintesi", attività che il Partner C.I.M.O. ASMD – PUGLIA, ha affidato alla Società EMMEFFE CONSULTING S.a.s., che è stata ultimata nel giro di pochi mesi per il quale lo stesso fornitore ha provveduto alla redazione di apposito documento di sintesi.

Nell'ambito della sotto-attività WP4 – 4.3 "Azioni informative interne ed esterne", poi, il Partner CARDIO ON LINE EUROPE ha avviato la progettazione di un supporto informatico (CD-ROM), contenente materiale multimediale di presentazione del Progetto e dei contenuti dello stesso, che interde mettere a disposizione della comunità dei cittadini e più specificatamente a disposizione delle parti economiche potenzialmente interessate dai risultati del Progetto e dai possibili servizi che si realizzeranno attraverso la Piattaforma "e-Salute" ed il Portale "Work-Care".

Nel corso dei primi mesi del 2007, in attesa di definire compiutamente l'insieme della attività di comunicazione da attuare e la tempistica di realizzazione delle



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

stesse, i Partner hanno proseguito comunque la realizzazione di operazioni propedeutiche, finalizzate al reperimento di tutte le informazioni che poi sono state effettivamente utilizzate attraverso i vari strumenti di comunicazione che adottati.

Nel mese di giugno/2007, i Partner hanno dato avvio anche all'ultima sotto-attività prevista dal WP4 (4.4 - Work-shop di follow-up tra i partner, Istituzioni regionali e tutti i possibili utilizzatori – edizione documento conclusivo), attivando la fase realizzativa delle operazioni di comunicazione e divulgazione dei risultati progettuali.

Partendo dal documento di progettazione preliminare, già precedentemente elaborato dal consulente della C.I.M.O. – ASMD, il partner CARDIO ON LINE EUROPE in qualità di attuatore delle predette attività di “comunicazione” ha provveduto ad individuare i soggetti/fornitori responsabili di puntualizzare e realizzare le diverse attività ipotizzate per il raggiungimento della massima diffusione e conoscenza del Progetto “626NET”. Nel dettaglio si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di due distinti soggetti/fornitori cui affidare rispettivamente:

- le azioni informative da attuare attraverso il Portale 626NET ed attraverso materiale divulgativo multimediale (*sotto-attività WP4 - 4.3*);
- la realizzazione del work-shop di follow-up (*sotto-attività WP4 - 4.4*).

Così come per i precedenti fornitori individuati, il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, nell'individuazione dei soggetti/fornitori delle attività di comunicazione ha operato del rispetto di quanto previsto dalla predette Linee Guida Operative emanate dalla Regione Puglia.

Per individuare il realizzatore dei contenuti della sotto-attività WP4 – 4.3, ha provveduto a richiedere preventivi a cinque società operanti nel settore. A seguito dell'esame da parte dei responsabili tecnici dei due Partner delle offerte ricevute, quale fornitrice è stata individuata la Società EMMEFFE CONSULTING S.a.s. di Bari (BA) che, oltre ad aver richiesto un corrispettivo inferiore a tutti i soggetti interpellati forniva anche importanti garanzie legate alla pregressa conoscenza del Progetto.

Analogamente, per la realizzazione del work-shop finale previsto dalla sotto-attività WP4 – 4.4, sono stati richiesti preventivi a società operanti nel settore ed analizzate le offerte pervenute, da parte degli stessi responsabili tecnici dei due Partner, è individuata la società CENTRO ITALIANO CONGRESSI – CIC SUD S.r.l. di Bari (BA).

Entrambi i fornitori hanno provveduto ad avviare immediatamente le attività.

La società EMMEFFE CONSULTING S.r.l. ha provveduto dapprima a fornire una prima parte dei 5.000 CD-ROM divulgativi e successivamente ha implementato il sito internet all'indirizzo www.626net.com.

In relazione alla realizzazione del work-shop di follow-up, la Società CIC SUD S.r.l., anche attraverso un continuo interfacciarsi con i referenti dei due Partner, ha individuato dapprima la data ottimale per l'organizzazione dell'evento e successivamente ha definito location e contenuti dello stesso.

Il work-shop di follow-up, dunque, è stato realizzato il giorno 29/09/2007, presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari, con il titolo di “**Telemedicina e sicurezza Aziendale**”. All'evento sono intervenuti circa 150 partecipanti oltre a numerose autorità politiche della Regione Puglia. Nel corso del convegno, come previsto sono stati discussi i risultati del Progetto “626-NET: La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive”, che rappresenta la prima esperienza nell'intero



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

territorio nazionale italiano di telemedicina finalizzata alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La società EMMEFFE CONSULTING S.r.l., sempre entro la fine del mese di Settembre/2007, ha completato l'implementazione del sito internet di Progetto, ed ha predisposto e fornito la parte residua dei CD-ROM divulgativi, peraltro distribuiti anche nel corso del predetto work-shop finale.

In relazione alla realizzazione del work-shop di follow-up, infine, la Società CIC SUD S.r.l., ha provvedendo ad attuare tutte le attività connesse con la realizzazione dell'evento come, l'attività di segreteria pre-congressuale, l'ideazione e realizzazione del logo del convegno, la stampa e la spedizione dei programmi, la stampa e l'affissione anche in ambulatori medici e reparti di ospedali di locandine, la realizzazione di totem esterni, la diramazione di comunicati stampa, il noleggio della sala congressi, la gestione delle adesioni dei partecipanti, la fornitura di hostess qualificate, la fornitura di cartelline congressuali personalizzate con il logo della manifestazione, l'organizzazione del cocktail finale.

La conclusione delle attività previste dal WP4, dunque, nella fase finale del Progetto è stata leggermente anticipata rispetto all'ultima previsione indicata nel relativo GANTT contenuto nella X° Relazione Quadrimestrale di SAL (dal 01/04/2007 al 31/07/2007) che ne prevedeva l'ultimazione al 31/12/2007 contestualmente alla chiusura del Progetto.

Effettuata una attenta analisi tra i Partner ed i predetti fornitori, si è valutato infatti, che il mese di settembre fosse sicuramente più adatto rispetto a quello di dicembre per realizzare un'attività di comunicazione efficace.

3. Risultati

Sotto-attività WP4 – 4.2: Report intermedio con i dati di sintesi della milestone 1

Per le attività previste dalla Sotto-Attività WP4 - 4.2, il Piano Dettagliato di Attuazione prevedeva anche il coinvolgimento del Partner CARDIO ON LINE EUROPE in merito alla definizione di un "manuale d'uso" della piattaforma telematica, la quale rappresenta la centrale operativa necessaria per l'erogazione dei servizi di telemedicina, e delle attrezzature periferiche che compongono il kit e-salute consegnato alle imprese per l'accesso ai predetti servizi. Poiché sia il completamento della piattaforma che l'avvio delle attività di sperimentazione hanno subito ritardi dovuti alla complessità delle operazioni di realizzazione dell'infrastruttura, ed al completamento del campione di imprese aderenti alla sperimentazione dei servizi, oggetto della presente sotto-attività sono rimaste le sole attività connesse alla definizione di una prima ipotesi di attività da realizzare in relazione alla comunicazione e diffusione dei risultati.

La EMMEFFE CONSULTING, incaricata dal Partner C.I.M.O. – ASMD, ha provveduto dunque, ad analizzare il contesto in cui il Progetto si stava realizzando ed ha elaborato un "Report" contenente la descrizione delle possibili attività di comunicazione da attuare, con indicazione degli obiettivi, delle modalità di attuazione della tempistica di attuazione delle attività stesse.

Documentazione prodotta:

⇒ Report "Organizzazione work-shop e contenuti Portale Sito Web"



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

Sotto-attività WP4 – 4.3: Azioni informative interne ed esterne attraverso il portale Work-Care

Come previsto dal Piano Dettagliato di Attuazione, la presente sotto-attività è stata finalizzata alla realizzazione di attività informative interne in quanto destinate ai soggetti già coinvolti nella realizzazione del Progetto, ad esempio le imprese aderenti alle attività di sperimentazione, ed esterne in quanto destinate a tutti i potenziali soggetti interessati ai servizi erogabili attraverso le infrastrutture realizzate con il Progetto “626-NET: La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive”.

Nell’ambito delle predetta attività il Partner CARDIO ON LINE EUROPE, dunque, ha affidato alla Società “EMMEFFE CONSULTING” non solo l’incarico di progettare ed implementare all’indirizzo www.626net.com il sito internet di Progetto, ma anche l’incarico di progettare e fornire supporti informatici divulgativi (CD-ROM Multimediali) contenenti informazioni relative ai risultati raggiunti. Tale ultimo strumento per quanto non previsto in sede di definizione del Piano Dettagliato di Attuazione, è stato realizzato in quanto ritenuto estremamente efficace in relazione agli attuali metodi di comunicazione e marketing, in quanto facilmente distribuibile ed allo stesso tempo immediatamente consultabile da tutti i potenziali soggetti interessati ai servizi di “telemedicina” di cui al Progetto 626-NET.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Implementazione del sito Internet all’indirizzo www.626net.com;
- ⇒ N. 5.000 CD-ROM Multimediali.

Sotto-attività WP4 – 4.4: Work-shop di follow-up tra i partner, Istituzioni regionali e tutti i possibili utilizzatori – edizione documento conclusivo

Nell’ambito della sotto-attività WPA – 4.4, come previsto è stato realizzato l’evento comunicativo conclusivo. Il Partner realizzatore CARDIO ON LINE EUROPE, ha provveduto ad individuare, attraverso il raffronto di cinque preventivi richiesti a società operanti nel settore, nella Società CENTRO ITALIANO CONGRESSI – CIC SUD S.r.l. di Bari (BA), il soggetto responsabile dell’organizzazione del predetto evento.

Definita la data ed i contenuti tecnici e scientifici caratterizzanti del work-shop, il fornitore ha provveduto alla individuazione della location e successivamente ha realizzato l’insieme delle operazioni connesse con la materiale organizzazione dell’evento. Lo stesso, infatti, oltre a fungere da segreteria organizzativa (segreteria pre-congressuale, stampa e spedizione dei programmi e degli inviti, fornitura di cartelline congressuali personalizzate con il logo della manifestazione), ha realizzato le azioni di promozione dell’evento (affissione di locandine, diramazione di comunicati stampa, la realizzazione di totem) ed ha curato la realizzazione del cocktail finale.

Documentazione prodotta:

- ⇒ Ideazione del logo della manifestazione;
- ⇒ Definizione della mailing-list dei soggetti da invitare;
- ⇒ Stampa di depliant contenente il programma dell’evento;
- ⇒ Stampa degli inviti e delle schede di adesione;
- ⇒ Stampa delle locandine;
- ⇒ Realizzazione di n. 2 totem;
- ⇒ Stampa di cartelline congressuali;
- ⇒ Diffusione di comunicati stampa;
- ⇒ Stampa dell’attestato di partecipazione distribuito ai partecipanti.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR PUGLIA MIS.6.2C



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO I.C.A.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

POR PUGLIA 2000-2006 - MISURA 6.2 - AZIONE C)

**Bando “Iniziative a sostegno del sistema
delle imprese e delle professioni”**

CONTRAENTE

C.I.M.O. - ASMD PUGLIA

TITOLO DEL PROGETTO

**“626 NET”: La Telemedicina per la
sicurezza nelle attività produttive**

RAPPORTO TECNICO FINALE

RENDICONTO ECONOMICO

(elenchi della documentazione di spesa)

**RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE DA INTERA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
PER IL PROGETTO "626 NET: La telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive"**

DESCRIZIONE	Importo ammesso	Importo I.V.A. ammessa	TOTALE AMESSO	TOTALI SPESE RENDICONTATE	TOTALI I.V.A. AMMISSIBILE RENDICONTATA	TOTALI RENDICONTATI
A) Personale	67.470,00	-	67.470,00	71.150,92	-	71.150,92
B) Consulenze	501.308,00	100.261,60	601.569,60	288.881,06	29.808,00	318.689,06
C) Licenze	191.980,00	38.396,00	230.376,00	213.480,00	-	213.480,00
D) Software	-	-	-	-	-	-
E) Nolo, leasing, ammortamento	-	-	-	-	-	-
F) Infrastrutture	945.520,00	189.104,00	1.134.624,00	947.777,40	-	947.777,40
G) Spese generali	89.441,00	17.888,20	107.329,20	55.780,00	-	55.780,00
G) Spese generali per COMUNICAZIONE	82.550,00	16.510,00	99.060,00	65.350,00	-	65.350,00
TOTALI	1.878.269,00	362.159,80	2.240.428,80	1.642.419,38	29.808,00	1.672.227,38
Percentuali di realizzazione				87,44%	8,23%	74,64%

SPESE COMPLESSIVE IN EURO PER ANNO		ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	TOTALI
TOTALI RENDICONTATI	SPESE DIRETTE	787.868,70	225.018,79	359.565,25	269.966,65	-	1.642.419,39
	IN LEASING	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	787.868,70	225.018,79	359.565,25	269.966,65	-	1.642.419,39

PERSONALE RIEPILOGO MENSILE

Partner	Dipendente COGNOME E NOME	2004												Totale ore	Aliquota oraia	Importo addebitabile. In Euro
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
		n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore			
CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	SIGNORE GIULIA	0	0	0	160	56	64	40	0	136	136	152	96	840	13,89	11.667,60
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	TOTALE													840		11.667,60

Partner	Dipendente COGNOME E NOME	2005												Totale ore	Aliquota oraia	Importo addebitabile. In Euro
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
		n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore			
CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	SIGNORE GIULIA	112	136	120	118	88	72	74	40	58	52	32	74	976	13,89	13.556,64
	RUSTICO SAVINO	0	0	0	68	26	42	26	0	56	54	46	28	346	13,98	4.837,08
	TOTALE													1.322		18.393,72

Partner	Dipendente COGNOME E NOME	2006												Totale ore	Aliquota oraia	Importo addebitabile. In Euro
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
		n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore			
CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	SIGNORE GIULIA	14	46	80	58	24	60	54	44	54	60	82	50	626	16,10	10.078,60
	RUSTICO SAVINO	34	64	64	50	56	70	80	0	70	62	70	34	654	14,43	9.437,22
	TOTALE													1.280		19.515,82

Partner	Dipendente COGNOME E NOME	2007												Totale ore	Aliquota oraia	Importo addebitabile. In Euro
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
		n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore	n. ore			
CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	SIGNORE GIULIA	56	104	78	72	48	44	38	32	60	77	52	66	727	16,14	11.733,78
	RUSTICO SAVINO	54	90	86	48	34	40	36	16	76	64	66	46	656	15,00	9.840,00
	TOTALE													1.383		21.573,78

TOTALE SPESE DEL PERSONALE

71.150,92

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Creazione infrastruttura per piattaforma telematica; Creazione del centro "E-SALUTE"	DEL VECCHIO & PARTNERS	24/04	02/10/2004	21/12/2004	Bonifico	11.830,00	2.366,00		14.196,00	11.830,00	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Assistenza e consulenza relativa a: ⇒ Fase A) "Predisposizione del Progetto Esecutivo e Piano Economico-Finanziario"; ⇒ avvio Fase C) "Assistenza e consulenza specislistica necessaria all'attivazione e realizzazione del progetto".	PROFIN SERVICE S.r.l.	45	14/12/2004	21/12/2004	Bonifico	30.000,00	6.000,00		36.000,00	30.000,00	6.000,00
CIMO - ASMD PUGLIA	Consulenza relativa alle attività di Analisi dei Fabbisogni informativi: ⇒ WP1 - Sotto-attività 1.1 ; ⇒ WP1 - Sotto-attività 1.2 ; ⇒ WP1 - Sotto-attività 1.3 .	EMMEFFE CONSULTING S.a.s.	19	06/10/2005	10/10/2005	BONIFICO BANCARIO	24.840,00	4.968,00		29.808,00	24.840,00	4.968,00
CIMO - ASMD PUGLIA	Assistenza e consulenza relativa al WP0 : ⇒ Fase B) "Definizione e predisposizione degli atti formali dalla Regione Puglia"; ⇒ Fase C) "Assistenza e consulenza specislistica necessaria all'attivazione e realizzazione del progetto".	PROFIN SERVICE S.r.l.	41	07/10/2005	10/10/2005	BONIFICO BANCARIO	25.000,00	5.000,00		30.000,00	25.000,00	5.000,00
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	15	23/12/2005	23/12/2005	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	15	29/12/2005	29/12/2005	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	875,00	-	-	875,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	39	29/12/2005	29/12/2005	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.083,00	-	416,60	1.666,40	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/01/2006	02/01/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.625,00	-	325,00	1.300,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	1	02/01/2006	02/01/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.313,00	262,00	262,00	1.313,00	374,94	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							98.566,00	18.796,00	1.203,60	116.158,40	93.419,72	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							98.566,00	18.796,00	1.203,60	116.158,40	93.419,72	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	////	02/01/2006	02/01/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.562,25	-	312,45	1.249,80	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	03/01/2006	03/01/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.041,50	-	208,20	833,30	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	5	31/01/2006	31/01/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.250,00	-	450,00	1.800,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	01/02/2006	01/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.625,00	-	325,00	1.300,00	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Maria Rosa	////	01/02/2006	01/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.375,00	-	275,00	1.100,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/02/2006	01/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.250,00	-	250,00	1.000,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	2	01/02/2006	01/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	16	03/02/2006	03/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	750,00	-	-	750,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	1	04/02/2006	04/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	750,00	-	-	750,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	2	28/02/2006	28/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.250,00	250,00	250,00	1.250,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	81	28/02/2006	28/02/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.375,00	-	275,00	1.100,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	01/03/2006	01/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.250,00	-	250,00	1.000,00	499,92	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							114.044,75	19.246,00	3.999,25	129.291,50	98.043,98	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							114.044,75	19.246,00	3.999,25	129.291,50	98.043,98	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/03/2006	01/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.500,00	-	300,00	1.200,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	4	01/03/2006	01/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.250,00	250,00	250,00	1.250,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	21	01/03/2006	01/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	9	03/03/2006	03/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.125,00	-	425,00	1.700,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	4	28/03/2006	28/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	500,00	100,00	100,00	500,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	01/04/2006	01/04/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.500,00	-	300,00	1.200,00	999,84	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/04/2006	01/04/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.375,00	-	275,00	1.100,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	18	03/04/2006	03/04/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	750,00	-	-	750,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	39	20/04/2006	20/04/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.250,00	250,00	250,00	1.250,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	6	27/04/2006	27/03/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.281,48	256,30	256,30	1.281,48	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	02/05/2006	02/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.690,00	-	338,00	1.352,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/05/2006	02/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.560,00	-	312,00	1.248,00	249,96	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							129.826,23	20.302,30	7.005,55	143.122,98	103.168,16	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							129.826,23	20.302,30	7.005,55	143.122,98	103.168,16	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	15	02/05/2006	02/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.102,50	-	620,50	2.482,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	7	03/05/2006	03/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.940,00	388,00	388,00	1.940,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	19	03/05/2006	03/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.039,00	-	-	1.039,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	192	08/05/2006	08/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.312,50	-	262,50	1.050,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	50	08/05/2006	08/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.166,00	233,20	233,20	1.166,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	29/05/2006	29/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.897,50	-	397,50	1.500,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	8	31/05/2006	31/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	885,00	177,00	177,00	885,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	20	31/05/2006	31/05/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	760,00	-	-	760,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/06/2006	01/06/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.390,00	-	278,00	1.112,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	5	01/06/2006	01/06/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.011,00	-	-	1.011,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	17	01/06/2006	01/06/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.285,00	-	657,00	2.628,00	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	66	05/06/2006	05/06/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.263,00	252,60	252,60	1.263,00	124,98	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							148.877,73	21.353,10	10.271,85	159.958,98	107.042,54	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							148.877,73	21.353,10	10.271,85	159.958,98	107.042,54	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	11	08/06/2006	08/06/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.642,00	328,40	328,40	1.642,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	01/07/2006	01/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.770,00	-	354,00	1.416,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/07/2006	01/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.770,00	-	354,00	1.416,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	19	01/07/2006	01/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.530,00	-	506,00	2.024,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	72	02/07/2006	02/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.958,00	391,60	391,60	1.958,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	12	03/07/2006	03/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.516,00	332,00	332,00	1.516,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	21	03/07/2006	03/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.137,00	-	-	1.137,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	6	07/07/2006	07/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.011,00	-	-	1.011,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	9	22/07/2006	22/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	740,00	148,00	148,00	740,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	16	31/07/2006	31/07/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.140,00	228,00	228,00	1.140,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DIBENEDETTO Antonio	////	01/08/2006	01/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.520,00	-	304,00	1.216,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/08/2006	01/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.390,00	-	278,00	1.112,00	499,92	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							167.001,73	22.781,10	13.495,85	176.286,98	111.166,88	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							167.001,73	22.781,10	13.495,85	176.286,98	111.166,88	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/08/2006	01/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	885,00	-	177,00	708,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	85	04/08/2006	04/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	635,00	127,00	237,00	525,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	24	07/08/2006	07/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.780,00	-	556,00	2.224,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	280	31/08/2006	31/08/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.960,00	-	392,00	1.568,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/09/2006	01/09/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.770,00	-	354,00	1.416,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/09/2006	01/09/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.265,00	-	253,00	1.012,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	20	01/09/2006	01/09/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.263,00	252,60	252,60	1.263,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/09/2006	01/09/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	510,00	-	102,00	408,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	26	14/09/2006	14/09/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.780,00	-	556,00	2.224,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	9	01/10/2006	01/10/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.011,00	-	-	1.011,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/10/2006	02/10/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.520,00	-	304,00	1.216,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/10/2006	02/10/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.140,00	-	228,00	912,00	249,96	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							184.520,73	23.160,70	16.907,45	190.773,98	115.666,16	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							184.520,73	23.160,70	16.907,45	190.773,98	115.666,16	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	325	05/10/2006	05/10/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.645,00	-	329,00	1.316,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	28	06/10/2006	06/10/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.780,00	-	556,00	2.224,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/11/2006	02/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.895,00	-	379,00	1.516,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/11/2006	02/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.150,00	-	430,00	1.720,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/11/2006	02/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	635,00	-	127,00	508,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	32	02/11/2006	02/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.305,00	-	661,00	2.644,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	363	07/11/2006	07/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.770,00	-	354,00	1.416,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	23	10/11/2006	10/11/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.645,00	329,00	329,00	1.645,00	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/12/2006	01/12/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.265,00	-	253,00	1.012,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SANTORO Daniela	////	01/12/2006	01/12/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.015,00	-	203,00	812,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	38	01/12/2006	01/12/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.850,00	-	570,00	2.280,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	27	13/12/2006	13/12/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.390,00	278,00	278,00	1.390,00	1.124,82	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							206.865,73	23.767,70	21.376,45	209.256,98	121.415,24	15.968,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							206.865,73	23.767,70	21.376,45	209.256,98	121.415,24	15.968,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	10	20/12/2006	20/12/2006	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	675,00	135,00	135,00	675,00	249,96	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Consulenza relativa alle attività di Analisi dei Fabbisogni informativi: ⇒ WP3 - Sotto-attività 3.1.3; ⇒ WP4 - Sotto-attività 4.2; ⇒ WP4 - Sotto-attività 4.3;	EMMEFFE CONSULTING S.a.s.	26	21/12/2006	02/03/2007	BONIFICO BANCARIO	24.840,00	4.968,00		29.808,00	24.840,00	4.968,00
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	4	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	885,00	-	177,00	708,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.025,00	-	405,00	1.620,00	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.265,00	-	253,00	1.012,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	1	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.085,00	-	417,00	1.668,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	570,00	-	114,00	456,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	255,00	-	51,00	204,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SANTORO Daniela	////	02/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	825,00	-	165,00	660,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	1/2007	03/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	255,00	-	51,00	204,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	1	03/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.025,00	405,00	405,00	2.025,00	999,84	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							242.570,73	29.275,70	23.549,45	248.296,98	150.129,62	20.936,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							242.570,73	29.275,70	23.549,45	248.296,98	150.129,62	20.936,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	1	05/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.225,00	-	645,00	2.580,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	02/07	08/01/2007	02/01/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.263,00	252,60	252,60	1.263,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	1	31/01/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	510,00	102,00	102,00	510,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.912,50	-	382,50	1.530,00	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.530,00	-	306,00	1.224,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	2	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	765,00	153,00	153,00	765,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.147,50	-	229,50	918,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	510,00	-	102,00	408,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	255,00	-	51,00	204,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SANTORO Daniela	////	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.147,50	-	229,50	918,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	4	01/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.081,25	-	616,25	2.465,00	749,88	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							257.917,48	29.783,30	26.618,80	261.081,98	155.378,78	20.936,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							257.917,48	29.783,30	26.618,80	261.081,98	155.378,78	20.936,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	8	08/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.147,50	-	229,50	918,00	624,90	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Assistenza e consulenza relativa al WP0: ⇒ Fase C) "Assistenza e consulenza specialistica necessaria all'attivazione e realizzazione del progetto".	PROFIN SERVICE S.r.l.	10	09/02/2007	02/03/2007	BONIFICO BANCARIO	11.666,67	2.333,33		14.000,00	11.666,67	2.333,33
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	17/07	12/02/2007	01/02/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.403,00	280,60	280,60	1.403,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP1 - Sotto-Attività 1.3 - Analisi dei fabbisogni informativi imprese pugliesi WP3 - Sotto-Attività 3.1 - Integrazione funzionale della piattaforma WP3 - Sotto-Attività 3.1.1 - Integrazione consulenti medici WP3 - Sotto-Attività 3.1.2 - Integrazione funzionalità operative	DEL VECCHIO & PARTNERS	103-07	15/02/2007	19/02/2007	Bonifico Bancario	40.900,00	8.180,00	-	49.080,00	40.900,00	-
					23/04/2007	Bonifico Bancario						
					05/07/2007	Bonifico Bancario						
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PASSANTINO Andrea	23/07	28/02/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.785,00	357,00	357,00	1.785,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	2	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	385,00	77,00	77,00	385,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.530,00	-	306,00	1.224,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.147,50	-	229,50	918,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	61	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.657,50	-	331,50	1.326,00	874,86	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							319.539,65	41.011,23	28.429,90	332.120,98	211.569,87	23.269,33
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							319.539,65	41.011,23	28.429,90	332.120,98	211.569,87	23.269,33

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.275,00	-	255,00	1.020,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	510,00	-	102,00	408,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	255,00	-	51,00	204,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SANTORO Daniela	////	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	892,50	-	178,50	714,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	7	01/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.677,50	-	535,50	2.142,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	11	03/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	510,00	-	102,00	408,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	5/2007	26/03/2007	01/03/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	382,50	-	76,50	306,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	13	30/03/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	930,00	-	186,00	744,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	4	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	919,00	183,80	183,80	919,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.382,50	-	476,50	1.906,00	999,84	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	6/2007	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	391,25	-	78,25	313,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.131,50	-	426,30	1.705,20	499,92	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							332.796,40	41.195,03	31.081,25	342.910,18	216.819,03	23.269,33
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							332.796,40	41.195,03	31.081,25	342.910,18	216.819,03	23.269,33

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	106	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.752,50	-	550,50	2.202,00	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	////	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.710,00	-	342,00	1.368,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	662,50	-	132,50	530,00	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	02/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	397,50	-	79,50	318,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	8	04/04/2007	02/04/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.420,00	-	684,00	2.736,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	6	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	516,00	103,20	103,20	516,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	17	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	520,00	-	104,00	416,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.700,00	-	340,00	1.360,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	8/2007	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	130,41	-	26,00	104,41	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.680,00	-	336,00	1.344,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PELLEGRINO Pier Luigi	////	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	540,00	-	108,00	432,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	570,00	-	114,00	456,00	374,94	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							347.395,31	41.298,23	34.000,95	354.692,59	221.818,23	23.269,33
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							347.395,31	41.298,23	34.000,95	354.692,59	221.818,23	23.269,33

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	02/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	260,00	-	52,00	208,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	11	06/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.404,00	-	680,80	2.723,20	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	161	24/05/2007	02/05/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.550,00	-	310,00	1.240,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.695,50	-	539,10	2.156,40	1.249,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	9/2007	01/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	606,00	-	121,20	484,80	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	520,00	-	104,00	416,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	408,00	-	81,60	326,40	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	8	04/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.084,00	216,80	216,80	1.084,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	20	05/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.051,50	-	210,30	841,20	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	13	08/06/2007	04/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	4.225,50	-	845,10	3.380,40	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	185	15/06/2007	15/06/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.687,00	-	537,40	2.149,60	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	21	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	522,00	-	104,40	417,60	374,94	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							366.408,81	41.515,03	37.803,65	370.120,19	227.692,29	23.269,33
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							366.408,81	41.515,03	37.803,65	370.120,19	227.692,29	23.269,33

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.076,00	-	415,20	1.660,80	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	LICCESE Mariarosa	10/2007	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	399,00	-	79,80	319,20	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.452,50	-	290,50	1.162,00	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	516,00	-	103,20	412,80	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	02/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	258,00	-	51,60	206,40	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	201	06/07/2007	06/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	915,00	-	183,00	732,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	23	06/07/2007	02/07/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.862,00	-	572,40	2.289,60	874,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.950,00	-	390,00	1.560,00	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.348,00	-	269,60	1.078,40	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	411,00	-	82,20	328,80	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	384,00	-	76,80	307,20	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	26	03/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	839,00	-	167,80	671,20	249,96	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							379.819,31	41.515,03	40.485,75	380.848,59	234.066,27	23.269,33
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							379.819,31	41.515,03	40.485,75	380.848,59	234.066,27	23.269,33

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	207	04/08/2007	04/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.814,00	-	562,80	2.251,20	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	25	07/08/2007	01/08/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.428,00	-	685,60	2.742,40	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	217	02/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.528,00	-	705,60	2.822,40	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	27	03/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.444,50	-	288,90	1.155,60	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	03/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.683,00	-	336,60	1.346,40	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	03/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.518,00	-	303,60	1.214,40	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	03/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	282,00	-	56,40	225,60	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	27	03/09/2007	03/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.078,00	-	615,60	2.462,40	1.874,70	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Assistenza e consulenza relativa al WP0: ⇒ Fase C) "Assistenza e consulenza specislistica necessaria all'attivazione e realizzazione del Progetto".	PROFIN SERVICE S.r.l.	38	28/09/2007	02/01/2008	BONIFICO BANCARIO	3.333,33	666,67		4.000,00	3.333,33	666,67
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MANCINI Luigi	22	29/09/2007	29/09/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.520,00	304,00	304,00	1.520,00	749,88	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	516,00	-	103,20	412,80	499,92	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							402.964,14	42.485,70	44.448,05	401.001,79	244.398,48	23.936,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							402.964,14	42.485,70	44.448,05	401.001,79	244.398,48	23.936,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.548,00	-	309,60	1.238,40	499,92	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	244	01/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.301,00	-	460,20	1.840,80	1.249,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	387,00	-	77,40	309,60	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	258,00	-	51,60	206,40	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/10/2007	02/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	635,00	-	127,00	508,00	124,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	31	09/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	786,00	-	157,20	628,80	374,94	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Consulenza relativa alle attività di Redazione del documento conclusivo di Progetto: ⇒ WP4 - Sotto-attività 4.4	EMMEFFE CONSULTING S.a.s.	6	11/10/2007	02/01/2008	BONIFICO BANCARIO	9.360,00	1.872,00		11.232,00	9.360,00	1.872,00
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	32	19/10/2007	01/10/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.709,00	-	541,80	2.167,20	1.749,72	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	02/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.419,00	-	283,80	1.135,20	1.249,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	02/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.806,00	-	361,20	1.444,80	624,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	02/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	516,00	-	103,20	412,80	499,92	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							424.689,14	44.357,70	46.921,05	422.125,79	260.757,36	25.808,00
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							424.689,14	44.357,70	46.921,05	422.125,79	260.757,36	25.808,00

CONSULENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Ritenuta d'acconto	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	02/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	258,00	-	51,60	206,40	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	279	14/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	2.295,00	-	459,00	1.836,00	1.124,82	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	PARISI Carmela	294	21/11/2007	21/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.725,00	-	345,00	1.380,00	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	36	23/11/2007	02/11/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.428,00	-	685,60	2.742,40	1.999,68	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	DI BENEDETTO Antonio	////	01/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	387,00	-	77,40	309,60	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	MAGISTRO Marcantonio	////	01/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	1.818,00	-	363,60	1.454,40	1.249,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RICCO Stella Maria	////	01/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	387,00	-	77,40	309,60	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	RIZZO Umberto	////	01/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	258,00	-	51,60	206,40	249,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	BRUNETTI Natale Daniele	11	03/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	387,00	77,40	77,40	387,00	374,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	CACCAVO Vincenzo	36	03/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	785,00	-	157,00	628,00	374,94	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Assistenza e consulenza relativa al WP0: "Assistenza e consulenza specislistica connessa con la realizzazione e chiusura del Progetto".	PROFIN SERVICE S.r.l.	47	07/12/2007	02/01/2008	BONIFICO BANCARIO	20.000,00	4.000,00		24.000,00	20.000,00	4.000,00
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	WP2 - Sotto-Attività 2.3 - Consulenza relativa all'attività di sperimentazione	SEBASTIANI Michelangelo	38	30/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario BANCA MERIDIANA	3.078,00	-	615,60	2.462,40	1.499,76	-
						TOTALI	459.495,14	48.435,10	49.882,25	458.047,99	288.881,06	29.808,00

LICENZE

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Paganento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Licenze software applicativo cardiologia e monitoraggio MPM; Licenze postazioni; Moduli per gestione piattaforma telematica	DEL VECCHIO & PARTENERS	23/04	01/10/2004	21/12/2004	BONIFICO	213.480,00	42.696,00	256.176,00	213.480,00	-
						TOTALI	213.480,00	42.696,00	256.176,00	213.480,00	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relativa al periodo 01/04/04 - 31/05/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00590359	07/06/2004	15/07/2004	Addebito conto corrente bancario	92,46	18,49	111,00	46,23	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610516 relativa al periodo 01/04/04 - 31/05/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00590313	07/06/2004	15/07/2004	Addebito conto corrente bancario	110,97	22,19	133,00	55,49	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805613578 relativa al periodo 01/04/04 - 31/05/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00590185	07/06/2004	15/07/2004	Addebito conto corrente bancario	60,54	12,11	72,50	30,27	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Maggio-Giugno 2004	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412624	24/06/2004	14/07/2004	Addebito conto corrente bancario	468,53	93,71	562,24	234,27	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805613578 relativa al periodo 01/06/04 - 31/07/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00797746	05/08/2004	15/09/2004	Addebito conto corrente bancario	60,40	12,08	72,50	30,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relativa al periodo 01/06/04 - 31/07/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00797844	05/08/2004	15/09/2004	Addebito conto corrente bancario	100,40	20,08	120,50	50,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610516 relativa al periodo 01/06/04 - 31/07/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00797816	05/08/2004	15/09/2004	Addebito conto corrente bancario	90,56	18,11	108,50	45,28	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Luglio-Agosto 2004	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412625	27/08/2004	16/09/2004	Addebito conto corrente bancario	135,05	27,01	162,06	67,53	-
CIMO - ASMD PUGLIA	Polizza fideiussoria a favore REGIONE PUGLIA a garanzia anticipazione 30% del contributo	SAN REMO S.p.A.	Polizza n. 58243	Data Polizza 13/10/2004	13/10/2004	Assegno Circolare n. 51-02274920 Banca Meridiana	4.368,00	-	4.368,00	4.368,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Pile alcaline 9v mod. PROCELL per apparecchi elettromedicali	ACCU ITALIA S.p.A.	6593	15/09/2004	29/11/2004	RI.BA.	547,11	109,42	656,53	536,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Toner SAMSUNG per stampanti mod. ML1510/1710/175	ALFA COMPUTER S.r.l.	315	30/09/2004	30/09/2004	Assegno Bancario n. 0065828668 Banca Meridiana	540,00	108,00	648,00	270,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Hardware per uffici amministrativi: - Stampanti SAMSUNG; - Stabilizzatori UPS.	ALFA COMPUTER S.r.l.	316	30/09/2004	30/09/2004	Assegno Bancario n. 0065828669 Banca Meridiana	850,00	170,00	1.020,00	425,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805613578 relativa al periodo 01/08/04 - 30/09/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00998231	06/10/2004	15/11/2004	Addebito conto corrente bancario	47,91	9,58	57,50	23,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relativa al periodo 01/08/04 - 30/09/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00998326	06/10/2004	15/11/2004	Addebito conto corrente bancario	107,77	21,55	129,50	53,89	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							7.579,70	642,33	8.221,83	6.236,30	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							7.579,70	642,33	8.221,83	6.236,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610516 relativa al perido 01/08/04 - 30/09/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00998301	06/10/2004	15/11/2004	Addebito conto corrente bancario	39,22	7,84	47,00	19,61	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al perido Settembre-Ottobre 2004	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412626	02/11/2004	22/11/2004	Addebito conto corrente bancario	249,25	49,85	299,10	124,63	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relativa al perido 01/10/04 - 30/11/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00081903	06/12/2004	17/01/2005	Addebito conto corrente bancario	227,36	45,47	272,50	113,68	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805046351 relativa al perido 01/10/04 - 30/11/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00078911	06/12/2004	14/01/2005	Bollettino Postale	158,75	31,75	190,50	79,38	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610516 relativa al perido 01/10/04 - 30/11/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00081910	06/12/2004	17/01/2005	Addebito conto corrente bancario	48,13	9,63	58,00	24,07	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805613578 relativa al perido 01/10/04 - 30/11/04	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00085207	06/12/2004	17/01/2005	Addebito conto corrente bancario	57,30	11,46	69,00	28,65	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al perido Novembre-Dicembre 2004	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412627	05/01/2005	25/01/2005	Addebito conto corrente bancario	243,05	48,61	291,66	121,53	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805613578 relativa al perido 01/12/04 - 31/01/05	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00272833	07/02/2005	15/03/2005	Addebito conto corrente bancario	548,37	9,63	558,00	274,19	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relativa al perido 01/12/04 - 31/01/05	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00268024	07/02/2005	15/03/2005	Addebito conto corrente bancario	268,55	53,71	322,50	134,28	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013341561 relativa al perido Marzo-Aprile 2005	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00273239	07/02/2005	25/03/2005	Bollettino Postale	289,49	57,90	347,50	144,75	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610516 relativa al perido 01/12/04 - 31/01/05	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00266159	07/02/2005	15/03/2005	Addebito conto corrente bancario	43,97	8,79	52,50	21,99	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805045701 relativa al perido Marzo-Aprile 2005	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00268496	07/02/2005	14/03/2005	Bollettino Postale	832,67	166,53	999,00	416,34	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805046351 relativa al perido 01/12/04 - 31/01/05	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00268298	07/02/2005	14/03/2005	Bollettino Postale	253,87	50,77	304,50	126,94	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							10.839,68	1.194,27	12.033,59	7.866,29	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							10.839,68	1.194,27	12.033,95	7.866,29	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Hardware per uffici amministrativi: - Server HP ML210T; - Masterizzatore SAMSUNG DVD	KIABARA S.r.l.	2/05	17/02/2005	17/02/2005	Assegno Bancario n. 0066276586 Banca Meridiana	1.454,00	290,80	1.744,80	727,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412628	02/03/2005	22/03/2005	Addebito conto corrente bancario	225,27	45,05	270,32	112,64	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/01/2005 - 01/04/2005 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	03/05	11/03/2005	11/03/2005	Assegno Bancario n. 0066276572 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Aprile/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5009569	21/03/2005	13/05/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,50	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo febbraio-marzo 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	4220805800016920	06/04/2005	13/05/2005	Bollettino Postale	2.667,21	533,16	2.744,22	1.333,61	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013341561 relative al periodo maggio-giugno 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	8S00449801	06/04/2005	13/05/2005	Bollettino Postale	289,49	57,90	347,50	144,75	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Maggio/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5011084	20/04/2005	13/05/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,00	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Marzo-Aprile 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412629	02/05/2005	23/05/2006	Addebito conto corrente bancario	1.014,40	202,88	1.217,28	507,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/04/2005 - 01/06/2005 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	08/05	01/06/2005	01/06/2005	Assegno Bancario n. 0066279892 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo aprile-agosto 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	8S00655737	07/06/2005	14/07/2005	Bollettino Postale	761,03	152,21	913,00	380,52	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo aprile-maggio 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	4220805800024740	07/06/2005	15/07/2005	Addebito conto corrente bancario	1.513,95	302,79	1.801,00	756,98	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Luglio/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5014125	20/06/2005	14/07/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,00	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Maggio-Giugno 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412621	03/07/2005	23/07/2006	Addebito conto corrente bancario	461,33	92,27	553,60	230,67	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							25.587,56	4.143,57	29.258,41	15.240,23	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							25.587,56	4.143,57	29.258,41	15.240,23	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Agosto/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5015641	20/07/2005	29/09/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,50	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo giugno-luglio 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	4220805800031770	05/08/2005	15/09/2005	Addebito conto corrente bancario	1.513,80	302,76	2.317,00	756,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo settembre-ottobre 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	8S00849912	05/08/2005	16/09/2005	Bollettino Postale	251,49	50,30	302,00	125,75	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Settembre/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5017152	20/08/2005	16/09/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,50	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/06/2005 - 01/09/2005 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	14/05	01/09/2005	01/09/2005	Assegno Bancario n. 006628544303 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo luglio-agosto 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412622	02/09/2005	22/09/2005	Addebito conto corrente bancario	684,27	136,85	821,12	342,14	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Ottobre/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5018636	20/09/2005	02/11/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,00	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo novemb.-dicemb. 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	8S01065112	06/10/2005	22/11/2005	Bollettino Postale	251,49	50,30	301,50	125,75	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo agosto-settembre 2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	4220805800040300	06/10/2005	14/11/2005	Addebito conto corrente bancario	1.514,21	302,84	2.317,50	757,11	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Novembre/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5020230	20/10/2005	22/11/2005	Bollettino Postale	54,40	10,88	65,50	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo settembre-ottobre 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412623	02/11/2005	22/11/2005	Addebito conto corrente bancario	587,91	117,58	705,49	293,96	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Dicembre/2005	TELECOM ITALIA S.p.a.	2TT5021707	21/11/2005	16/01/2006	Addebito conto corrente bancario	54,40	10,88	65,00	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo gennaio-febbraio 2006	TELECOM ITALIA S.p.a.	8S00003599	06/12/2005	13/01/2006	Addebito conto corrente bancario	251,49	50,30	302,00	125,75	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							34.013,22	5.828,70	40.370,32	19.453,06	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							34.013,22	5.828,70	40.370,32	19.453,06	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo ottobre-novembre 2005	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800000180	06/12/2005	13/01/2006	Addebito conto corrente bancario	1.521,28	304,26	2.331,50	760,64	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Toner SAMSUNG per stampanti mod. ML1510/1710/175	ALFA COMPUTER S.r.l.	434	14/12/2005	14/12/2005	Assegno Bancario n. 006638013112 Banca Meridiana	610,00	122,00	732,00	305,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/09/2005 - 01/01/2006 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	17/05	14/12/2005	14/12/2005	Assegno Bancario n. 0027611186 Banca Pop. Pugliese	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Gennaio/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT5023180	20/12/2005	16/01/2006	Addebito conto corrente bancario	54,40	10,88	65,50	27,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo novembre-dicembre 2005	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412624	06/01/2006	26/01/2006	Addebito conto corrente bancario	548,48	109,70	658,18	274,24	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Febbraio/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6010987	20/01/2006	15/03/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo marzo-aprile 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800007650	06/02/2006	13/03/2006	Addebito conto corrente bancario	1.575,99	315,20	2.058,50	788,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo marzo-aprile 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00208725	06/02/2006	13/03/2006	Addebito conto corrente bancario	251,69	50,34	302,00	125,85	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Marzo/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6012428	20/02/2006	16/03/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo gennaio-febbraio 2006	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412625	23/02/2006	15/03/2006	Addebito conto corrente bancario	636,68	127,34	764,02	318,34	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Stampante CANON Laser Shot LBP-5200 Plastificatrice GBG Heatseal H65 A4	ALFA COMPUTER S.r.l.	101	10/03/2006	01/03/2006	Assegno Bancario n. 006715144901 Banca Meridiana	456,00	91,20	547,20	228,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Aprile/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6013857	20/03/2006	18/04/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/01/2006 - 01/04/2006 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	06/06	27/03/2006	27/03/2006	Assegno Bancario n. 006715295512 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							46.029,54	8.231,98	55.463,32	25.461,22	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							46.029,54	8.231,98	55.463,32	25.461,22	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo maggio-giugno 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00443310	06/04/2006	15/05/2006	Addebito conto corrente bancario	251,69	50,34	302,00	125,85	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo maggio-giugno 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800015150	06/04/2006	15/05/2006	Addebito conto corrente bancario	1.922,39	384,48	2.831,50	961,20	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Maggio/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6015280	20/04/2006	15/05/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo marzo-aprile 2006	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412626	26/04/2006	16/05/2006	Addebito conto corrente bancario	555,86	111,17	667,03	277,93	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Giugno/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6016693	20/05/2006	15/06/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo luglio-agosto 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800022390	07/06/2006	13/07/2006	Addebito conto corrente bancario	1.576,04	315,21	2.391,50	788,02	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo luglio-agosto 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00633919	07/06/2006	13/07/2006	Addebito conto corrente bancario	251,69	50,34	302,00	125,85	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/05/2006 - 01/07/2006 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	15/06	13/06/2006	13/06/2006	Assegno Bancario n. 006715819109 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Luglio/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6018122	20/06/2006	17/07/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo maggio-giugno 2006	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412627	26/06/2006	17/07/2006	Addebito conto corrente bancario	595,72	119,14	714,86	297,86	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/07/2006 - 01/09/2006 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	16/06	12/07/2006	12/07/2006	Assegno Bancario n. 006715976106 Banca Meridiana	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Agosto/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6019539	20/07/2006	16/08/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 0805610336 relative al periodo settembre-ottobre 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800028330	07/08/2006	13/09/2006	Addebito conto corrente bancario	1.550,28	310,06	2.361,00	775,14	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							59.149,61	10.856,00	72.732,81	32.021,25	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							59.149,61	10.856,00	72.732,81	32.021,25	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al periodo settembre-ottobre 2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00814939	07/08/2006	13/09/2006	Addebito conto corrente bancario	251,69	50,34	302,00	125,85	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199136393 relativa ad Settembre/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6020954	21/08/2006	15/09/2006	Addebito conto corrente bancario	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Luglio-Agosto 2006	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412628	02/09/2006	22/06/2006	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	960,06	192,01	1.152,07	480,03	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Ottobre/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6022355	20/09/2006	16/10/2006	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,60	10,92	65,50	27,30	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 6/06	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S01024590	05/10/2006	13/11/2006	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	302,00	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 6/06	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220806800034720	05/10/2006	13/11/2006	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	2.026,78	305,26	2.332,00	1.013,39	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Novembre/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6023754	20/10/2006	15/11/2006	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,41	10,88	65,50	27,21	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Settembre-Ottobre 2006	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412629	02/11/2006	22/11/2006	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	669,43	133,89	803,32	334,72	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/10/2006 - 01/12/2006 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	22/06	07/11/2006	07/11/2006	Assegno Bancario n. 006716500 BANCA MERIDIANA	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	200/06	18/11/2006	18/11/2006	Assegno Bancario n. 006163165 BANCA MERIDIANA	500,00	100,00	600,00	250,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Dicembre/2006	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6025154	20/11/2006	12/12/2006	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 1/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00028041	06/12/2006	15/01/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	302,00	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 1/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800000867	06/12/2006	15/01/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	2.141,98	328,30	2.470,50	1.070,99	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							69.519,87	12.729,86	84.977,50	37.206,38	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							69.519,87	12.729,86	84.977,50	37.206,38	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Gennaio/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT6026543	20/12/2006	15/01/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,00	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/01/2007 - 01/03/2007 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	01/07	17/01/2007	17/01/2007	Assegno Bancario n. 0067436417 BANCA MERIDIANA	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Febbraio/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7018329	20/01/2007	15/02/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 2/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00241500	06/02/2007	13/03/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	301,50	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 2/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800007672	06/02/2007	13/03/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	2.269,01	353,71	2.622,50	1.134,51	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia	ROBERTO ANTONIO	26/07	20/02/2007	20/02/2007	Assegno Bancario n. 0067442674 BANCA MERIDIANA	405,62	81,12	486,74	202,81	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Marzo/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7019720	20/02/2007	15/03/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412622	23/02/2007	15/03/2007	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	750,49	150,10	900,59	375,25	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Aprile/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7021079	20/03/2007	16/04/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 3/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00387117	05/04/2007	14/05/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	302,00	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 3/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800012566	05/04/2007	14/05/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	2.324,13	359,93	2.684,00	1.162,07	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/03/2007 - 01/06/2007 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	04/07	19/04/2007	19/04/2007	Assegno Bancario n. 0067446486 BANCA MERIDIANA	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Maggio/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7022438	20/04/2007	15/05/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
TOTALI DA RIPIORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							82.242,87	15.069,48	100.039,45	43.567,88	-
TOTALI RIPIORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							82.242,87	15.069,48	100.039,45	43.567,88	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Marzo-Aprile 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412623	22/04/2007	12/05/2007	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	611,87	122,37	734,24	305,94	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Giugno/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7023788	21/05/2007	15/06/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,00	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	102/07	25/05/2007	25/05/2007	Assegno Bancario n. 0067448108 BANCA MERIDIANA	503,25	100,65	603,90	251,63	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 4/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800019013	06/06/2007	13/07/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	3.484,36	596,77	4.081,50	1.742,18	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Luglio/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7025099	20/06/2007	16/07/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Maggio-Giugno 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412624	22/06/2007	12/07/2007	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	595,31	119,06	714,37	297,66	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	134/07	06/07/2007	06/07/2007	Assegno Bancario n. 0067442680 BANCA MERIDIANA	986,55	197,31	1.183,86	493,28	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/06/2005 - 01/09/2005 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	07/07	09/07/2007	06/07/2007	Assegno Bancario n. 0067444190 BANCA MERIDIANA	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Agosto/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7026410	20/07/2007	16/05/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 5/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00782008	06/08/2007	13/09/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	302,00	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 5/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800025110	06/08/2007	13/09/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	3.053,53	510,62	3.564,00	1.526,77	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Luglio-Agosto 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412625	22/08/2007	11/09/2007	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	936,80	187,36	1.124,16	468,40	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Settembre/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7027710	25/08/2007	21/09/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							95.983,18	17.617,35	116.327,79	50.438,04	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							95.983,18	17.617,35	116.327,79	50.438,04	-

SPESE GENERALI

Partner	Descrizione	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data Pagamento	Modalità di pagamento	Imponibile	IVA	Totale fattura	Costi ammissibili in progetto	I.V.A. ammissibile in progetto
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	159/07	05/09/2007	04/09/2007	Assegno Bancario n. 0068049823 BANCA MERIDIANA	500,00	100,00	600,00	250,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Nota credito per strorno parziale fattura n. 4220807800019013 del 06/06/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	6920070914000180	18/09/2007	18/09/2007	//////////	1.420,86	284,17	1.705,03	710,43	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Ottobre/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7028992	20/09/2007	15/10/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 08013045878 relativa al bimestre n. 6/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	8S00949629	05/10/2007	13/11/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	251,60	50,32	302,00	125,80	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 6/07	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220807800031646	05/10/2007	13/11/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	2.862,95	472,55	3.335,50	1.431,48	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	186/07	16/10/2007	16/10/2007	Assegno Bancario n. 0068049837 BANCA MERIDIANA	663,80	132,76	796,56	331,90	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Novembre/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7030268	20/10/2007	15/11/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,50	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Canone fitto immobile sede segale periodo 01/10/2007 - 31/12/2007 (Rif. Contratto del 01/01/2005)	NICOLA RUTIGLIANO	10/07	09/11/2007	09/11/2007	Assegno Bancario n. 0068049839 BANCA MERIDIANA	3.099,00	619,80	3.718,80	1.549,50	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 199-136393 relativa al periodo Dicembre/2007	TELECOM ITALIA S.p.A.	2TT7031535	20/11/2007	13/12/2007	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	54,51	10,90	65,00	27,26	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Settembre-Ottobre 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412626	23/11/2007	12/11/2007	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	741,82	148,36	890,18	370,91	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per cancelleria varia e toner per stampanti	ROBERTO ANTONIO	237/07	03/12/2007	03/12/2007	Assegno Bancario n. 0068203351 BANCA MERIDIANA	1.400,00	280,00	1.680,00	700,00	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza telefonica 088812098814 relativa al bimestre n. 1/08	TELECOM ITALIA S.p.A.	4220808850037359	06/12/2007	14/01/2008	Addebito c/c bancario BANCA MERIDIANA	1.088,15	117,48	1.205,63	544,08	-
CARDIO ON LINE EUROPE s.r.l.	Spese per utenza elettrica relativa al periodo Novembre-Dicembre 2007	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	720261120412627	23/12/2007	12/01/2008	Addebito c/c bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE	735,49	147,10	882,59	367,75	-
TOTALI DA RIPORTARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA							106.068,66	19.434,25	128.230,02	55.480,78	-
TOTALI RIPORTATI DA PAGINA PRECEDENTE							106.068,66	19.434,25	128.230,02	55.480,78	-

